

К338-1
0-88

ОТЧЕТЪ


Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДЪ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженийъ изъ
губернскаго дорожнаго капитала

за 1912 годъ.

Типографія С. А. Зайцевой.
г. Орель—1913 г.

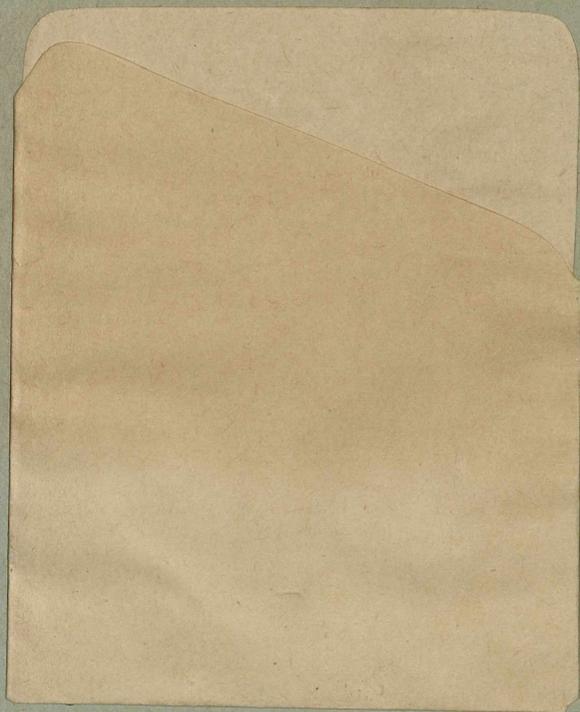

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
266	А. Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала Уѣздными Земствами							
	Орловскій уѣздъ.							
	<i>Наугорскій трактъ.</i>							
	Въ концѣ с. Бакланова построена мостовая и дубовый мостъ.							
	Мощеніе	134,10	3 ¹ / ₂ 2	—	} 2440 53	} 2440 53		
	Мостъ	2,00	3,00	0,6				
26в	На 25 верстѣ мостовая и каменный мостъ.							
	Мощеніе	120,00	3 ¹ / ₂ 2	0,5	} 1669 13	} 1669 13		
	Мостъ	Отверст. 0,40	3,00					
	<i>Лавровская дорога.</i>							
46е 86	Въ с. Лавровѣ построена мостовая	341,25	3 ¹ / ₂ 2	—	2545 34	100		
	<i>Подъездной путь къ ст. Нарышкино.</i>							
50/81	Въ Лукьянчиковѣ построена мостовая и мостъ съ 3-мя ледорѣзками.							
	Мостовая	180,00	3 ¹ / ₂ 2	—	} 5022 12	} 1200		
	Мостъ	12,00	2,67	1,88				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа не окончена.	—		1090	52	—		—			
Тоже.	Тоже	—		338	90	—		—			
Тоже.	Работа окончена.	158	42	—		—		160	46		Израсходовано: въ 1909 г. . 1219 р. 81 к. > 1910 г. . 273 р. 10 к. > 1911 г. . 713 р. 55 к. > 1912 г. . 158 р. 42 к. Итого . 2384 р. 88 к.
Тоже	Тоже.	1862	14	—		—		358	40		Израсходовано: въ 1911 г. . 2801 р. 58 к. > 1912 г. . 1862 р. 14 к. Итого . 4663 р. 72 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженияхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
51/47	<i>Бурскій трактъ.</i>							
	На 3 верстѣ построена мостовая и мостъ на каменныхъ опорахъ.		4 1/2		8230	55	600	—
	Мостовая	575,80	2	—				
	Мостъ	1,00	3,00	0,5				
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооруженій	—	—	—	6200	—	6200	—
—	На разъѣзды Членовъ Управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи.	—	—	—	—	—	711	17
	Итого по Орловскому уѣзду	—	—	—	26107	67	12920	83
	Мценскій уѣздъ.							
	<i>Мценско-Болховской трактъ.</i>							
74	Мостовая въ д. Выскребенцевъ отъ существующей мостовой въ уроч. „Сухая-Зуша“.				6940	16	—	—
	Мостовая	527,00	3,00	—				
	Земляное полотно.	527,00	3,00	—				
8	Паромная переправа въ дер. Карандаковой черезъ р. Оку	—	—	—	480	—	480	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 г.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа окончена.	1094	70	—	—	—	—	1145	36	Израсходовано: Въ 1911 г. . 5990 р. 49 к. > 1912 г. . 1094 р. 70 к. Итого . 7085 р. 19 к.
—	—	7192	07	—	—	992	07	—	—	
—	—	745	81	—	—	34	64	—	—	
—	—	11053	14	1429	42	1026	71	1664	22	
		12482 р. 56 к.		+ 637 р. 51 к.						
Хозяйствен.	Не окончена.	295	84	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1910 г. . 372 р. — к. > 1911 г. . 904 р. 74 к. > 1912 г. . 295 р. 84 к. Итого . 3571 р. 58 к.
Хозяйствен.	—	—	—	357	61	—	—	122	39	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
57	<i>Миценско-Курскій трактъ.</i>							
	Мостовая въ Стрѣлецкѣй слободѣ б. у 2-хъ будокъ М. К. жел. дор.							
	Мостовая	75,50	3,00	—	} 767	44	400	—
Земляное полотно.	75,50	3,00	4,00					
29 ^a	<i>Миценско-Бѣлевскій трактъ.</i>							
	Мостовая отъ гор. Миценска къ Висельской горѣ.							
	Мостовая	275,00	3,00	—	} 3085	21	2000	—
Земляное полотно.	275,00	3,00	4,00					
56 ^a	<i>Орловско-Новосилскій трактъ.</i>							
	Мостовая у 2-хъ мостовъ въ с. Аржаномѣ.							
	Мостовая	100,00	2,50	—	} 1451	41	—	—
Земляное полотно.	100,00	5,00	—					
75	<i>Орловско-Ливенскій трактъ.</i>							
	Мостовая въ дер. Давыдовкѣ.							
	Мостовая	54,00	2,50	—	} 986	98	—	—
Земляное полотно.	54,00	4,00	—					

Какимъ способомъ производилась работа хзяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственнымъ.	Окончена въ 1912 г.	—	—	799	55	32	11	—	—	Израсходовано: Въ 1911 г. . . 175 р. — к. » 1912 г. . . 2366 р. 28 к. Итого . 2541 р. 28 к.
Тоже.	Не окончена.	—	—	2366	28	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	211	40	—	—	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена въ 1911 г.	101	20	—	—	—	—	103	78	Израсходовано: Въ 1911 г. . . 782 р. — к. » 1912 г. . . 101 р. 20 к. Итого . 883 р. 20 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженихъ.			По техничскимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
	<i>Подъездные пути:</i>							
48	Отъ с. Клейменово къ ст. „Отрада“.							
	Паромная переправа черезъ р. Оку у дер. Жуковки				480	—	480	—
	Отъ с. Долгаго къ ст. „Становой Колодезь“.							
63	Гать и мостъ съ ледорѣзами въ с. Богородицкомъ.							
	Гать	34,00	4,00	—	2582	86	—	—
	Мостъ	12,00	2,67	2,40				
—	Пособіе об-ву кр-нъ дер. Ачкасовой на замощеніе горы							
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .				5400	—	5400	—
—	Содержаніе лошадей и инвентарь							
—	Содержаніе и разъѣзды десятника							
—	На разъѣзды Членовъ Управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи . .						533	72
	Итого по Мценскому уѣзду . . .				22174	06	9293	72

Какимъ способомъ произволилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
Хозяйственнымъ.	—			379	50			100	50		
Тоже.	Окончена въ 1912 г.	272	78					480	61		
—	—	20									
—	—			5218	43			181	57		
—	—			555	08	555	08				
—	—			360		360					
—	—			543	55	983					
				901	22	10580		957	02	988	85
				11481	р. 22	к.		+31	р. 83	к.	

Израсходовано:
 въ 1910 г. . 1504 р. 33 к.
 » 1911 г. . 325 р. 14 к.
 » 1912 г. . 272 р. 78 к.

 Итого . 2102 р. 25 к.

Кредитъ на означенные расходы предусмотрѣны сметами на работы.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
	Болховской уѣздъ.							
	<i>Плохинскій трактъ.</i>							
1 ж	Соединеніе Хотѣтовскихъ гатей устройствомъ шоссированной гати.	244,00	4,50 2,50	—	3373	86	3373	86
	<i>Бѣлевскій трактъ.</i>							
34	Улучшеніе подъема на Роговскую гору къ гор. Болхову съ шоссировкой по гати и мощеніемъ концовъ.							
	Шоссировки	245,00	2,50	—	6508	05	—	—
	Мощенія	40,00						
—	Уплачено въ счетъ поставки матеріала для сооруженія № 2	—	—	—	—	—	—	—
—	Содержаніе десятника и ремонтщиковъ	—	—	—	—	—	—	—
—	На ремонтъ и содержаніе исполнительныхъ сооруженій	—	—	—	—	—	3383	45
—	На разѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1% вознагражденіе слушающимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	515	25
	Итого по Болховскому уѣзду . . .	—	—	—	9881	91	7272	56

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	3665	50	291	64	—	—	Перерасходъ образовался вслѣдствіе дороговизны камня и песку.
Тоже.	Тоже.	—	—	236	52	1371	34	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 3339 р. 25 к. > 1911 г. . 4303 р. 62 к. > 1912 г. . 236 р. 52 к. <hr/> Итого . 7879 р. 39 к. Перерасходъ образовался вслѣдствіе болѣе дорогой покупки матеріаловъ, увеличенія количества земляныхъ работъ и дополнительнаго укрѣпленія откосовъ.
—	—	—	—	528	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	583	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5730	14	2346	69	—	—	
—	—	—	—	410	46	—	—	—	104	79
—	—	—	—	11153	62	4009	67	104	79	
						—3904 р. 88 к.				

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техниче-скимъ сметамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовать въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	Карачевскій уѣздъ.							
	<i>Карачевско-Дмитровскій трактъ.</i>							
40 ^a	Устройство моста и гати въ Новой Слободѣ.							
	Мостъ	7,00	2,67	1,00	1275	29	1275	29
	Гать	90,00	4,00	0,50				
72	Устройство гати и 2 мостовъ между Верхопольемъ и прилѣнами							
	Гать	674,50	3,00	0,20	1170	70	1170	70
	Мосты № 1 и № 2 по	1,00	2,67	0,40				
75	Устройство моста и гати у дер. Мазневой							
	Мостъ	14,00	2,67	1,30	3107	27	3107	27
	Гать	335,00	4,00	0,40				
71	Устройство моста и гати черезъ р. Мылинка							
	Мостъ	13,50	2,67	1,48	1356	52	1356	52
	Гать	68,50	4,00	0,35				
15	Устройство моста и гати въ дер. Казинкѣ.							
	Мостъ	11,00	2,67	1,00	1996	86	1996	86
	Гать	180,00	4,00	0,50				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ	Окончена въ 1911 г. но не принята.	—	—	1276	24	16	20	—	—	Израсходовано: въ 1911 г. . . 15 р. 25 к. » 1912 г. . 1276 р. 24 к. Итого . 1291 р. 49 к.
Тоже.	Тоже.	—	—	2320	92	1150	22	—	—	Перерасходъ получился вслѣдствіе значительнаго увеличенія земляныхъ работъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	2629	57	—	—	477	70	Остатокъ образовался благодаря выгодной сдачи работъ и уменьшенія земляныхъ работъ.
Тоже.	Окончена въ 1912 году.	356	52	1000	—	—	—	—	—	Работа окончена, но расчетъ не учиненъ.
Тоже.	Не окончена.	1222	65	774	21	—	—	—	—	Работа не окончена.


№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	3000	—	3000	—
	Содержаніе десятника .	—	—	—	—	—	—	—
	Внесено въ уплату 0/00 и погашеніе долга по правительственной субсидіи, выданной Орловскому Земству для работы въ Карачевскомъ уѣздѣ въ суммѣ 22500 руб.	—	—	—	—	—	1409	99
	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи.	—	—	—	—	—	533	20
	Итого по Карачевскому уѣзду .	—	—	—	11906	64	13849	83
	Брянскій уѣздъ.							
163	<i>Трактъ Дубровка-Грабовка.</i> Въ с. Давыдчихахъ, замощень булыжнымъ камнемъ въ плетняхъ и на мху спускъ къ мельницѣ съ правой стороны.							
	Мощенія	125,00	2,00	—	3445	50	3445	50
193	<i>Трактъ Почепъ-Жуковка.</i> Въ с. Морачево, по готовой насыпи сдѣлано хворостяное укрѣпленіе и поставлены укосины у моста.							
	Хворостяное укрѣпленіе	136,00	2,00	—	2144	66	479	66

Какимъ способомъ производилась работа хозяиномъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	—	—	—	78	96	—	—	2921	04	
—	—	—	—	175	—	175	—	—	—	
—	—	—	—	1409	99	—	—	—	—	
—	—	—	—	546	84	13	64	—	—	
—	—	—	—	1579	17	10211	73	1355	06	3398 74
				11790	р. 90 к.			+2043	р. 68 к.	
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	2500	—	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена.	1063	93	—	—	484	27	—	—	

Израсходовано:
въ 1910 г. . 1565 р. — к
> 1912 г. . 1063 р. 93 к.
Итого . 2628 р. 93 к.
Перерасходъ образовался въ виду дополнительныхъ работъ.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техничскимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Вѣсота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
130	Трактъ Людмика-Грбовка. На дорогѣ у моста черезъ р. Надву устроена часть каменной мостовой. Мощеніе <i>Отдѣльная работа.</i>	60,06	2,00	—	4205	14	2310	14
196	Въ д. Стипково по готовой насыпи сдѣлано хворостяное укрѣпленіе и поставлены укосины у моста. Хворостяное укрѣпленіе	110,00	2,00	—	2320	57	1320	57
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооруженій.	—	—	—	4034	44	4034	44
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 % вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	1071	31
	Итого по Брянскому уѣзду . . .	—	—	—	16150	31	12661	62

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или порядкомъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 г.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	520	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1911 г. . 1895 р. — к. » 1912 г. . 520 р. — к. Итого . 2415 р. — к.
Тоже.	Окончена.	1100	—	—	—	—	—	220	57	Израсходовано: въ 1911 г. . 1000 р. — к. » 1912 г. . 1100 р. — к. Итого . 2100 р. — к. Остатокъ образовался въ виду сдачи работъ съ торговъ по болѣе низкимъ цѣнамъ.
Тоже.	—	4420	19	—	—	385	75	—	—	
—	—	—	—	1085	39	14	08	—	—	
—	—	7104	12	3585	39	884	10	220	57	
		10689	р. 51 к.	—	—	—	—	663	р. 53 к.	



№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
	Трубчевскій уѣздъ.							
	<i>Трубчевско-Почепской трактъ.</i>							
31	Замощеніе части, устроенной въ 1898-1901 г.г. гати на участкѣ тракта Рамосуха-Семень.							
	Мощеніе	133,00	2,00	—	2685	22	2685	22
	<i>Трубчевско Брянскій трактъ.</i>							
	(Отъ гор. Трубчевска до с. Уручья.).							
33 ^a	Удлиненіе замощенія Бѣлиловской гати въ стор. гор. Трубчевска							
	Мощеніе	40,00	2,00	—	940	98	940	98
22	Укрѣпленіе оврага на 7 вер. тракта отъ гор. Трубчевска, противъ дер. Бѣлиловой, устройствомъ водоотводной канавы и одернованнаго водосточнаго лотка.							
	Канавы	50,00	1,10	—	261	03	261	03
	Лотокъ	13,50	1,50	—				
24	Постройка деревян. моста черезъ сухое русло въ с. Рябчевскѣ, съ земляными балластированными пескомъ подъѣздами къ нему.							
	Мостъ	13,00	3,00	1,65	1816	12	1816	12
	Подъѣзды (гати) .	34,00	4,00	—				

Какимъ способомъ произво-дилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
Смѣшаннымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	2573	52	—	—	111	70		Остатокъ образовался вслѣдствіе сдачи работъ по дешевымъ цѣнамъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	993	97	52	99	—	—		Перерасходъ образовался въ виду удорожанія работъ и матеріаловъ.
Подряднымъ.	Тоже.	—	—	335	42	74	39	—	—		Перерасходъ образовался вслѣдствіе поврежденія не окрѣпшаго сооруженія ливнемъ и исправленія этого сооруженія.
Тоже.	Тоже.	—	—	1684	60	—	—	—	—		

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техничскимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
21 ^б	<i>Трубчевско-Брянскій трактъ.</i> (Отъ с. Уручья до границы Брянскаго уѣзда).							
	Постройка деревян. моста на Казловской гати черезъ р. Посковку съ прокопкою новаго русла, засыпкою стараго и перемощеніе въѣздовъ.							
	Мостъ	15,00	3,00	1,80	2352	28	851	59
	Перемощеніе въѣздовъ	36,00	3,50	—				
16 ^в	<i>Трубчевско-Орловскій трактъ.</i>							
	Замощеніе части Усохской гати между мостами черезъ рѣки: Пороицу и Посоль.							
	Мощеніе	173,00	2,00	—	3127	97	3127	97
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооруженій	—	—	—	3630	05	3630	05
—	Наразѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	536	50
	Итого по Трубчевском уѣзду . .	—	—	—	14813	65	13849	46

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.		
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г. но не принята.	362	82	—	—	—	—	488	77	Израсходовано: Въ 1911 г. . 1500 р. 69 к. > 1912 г. . 362 р. 82 к. Итого . 1863 р. 51 к. Остатокъ образовался въ виду сдачи работъ и матеріаловъ съ торговъ по дешевымъ цѣнамъ.	
Смѣшаннымъ.	Окончена но не принята.	—	—	3127	—	—	—	—	97		
—	—	—	—	3494	77	—	—	—	135		28
—	—	—	—	532	03	—	—	—	447		
—	—	362	82	12741	31	127	38	741	19		
		13104 р. 13 к.				+613 р. 81 к.					

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	к.	Руб.	к.
Сѣвскій уѣздъ.								
<i>Орловско-Сѣвскій трактъ.</i>								
18 ^a	Продолженіе замощенія въ слободѣ Стрѣлецкой, съ устройствомъ двухъ переѣздныхъ мостиковъ.							
	Мощеніе	60,00	2,50	—	1219	38	1219	38
23	Постройка деревяннаго моста съ 11-ю ледорѣзками у Ямской слободы черезъ р. Сѣвъ.							
	Мостъ	56,00	3,00	2,00	9550	—	1016	91
32	Постройка деревяннаго моста черезъ р. Усожу въ Усожскихъ постоянныхъ дворахъ							
	Мостъ	37,30	3,00	1,70	5350	—	5350	—
<i>Сѣвско-Будлянскій трактъ.</i>								
40	Замощеніе дороги въ Запорицкой части г. Сѣвска, на первой верстѣ отъ поворота съ большого Кіевскаго тракта къ Пушкарной слободѣ.							
	Мощеніе	245,00	2,50	—	3930	62	3930	62
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	1000	—	1000	—
—	Наразѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	546	28
	Итого по Сѣвскому уѣзду . . .	—	—	—	21050	—	13063	19

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	к.	Руб.	к.	Руб.	к.	Руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	1130	85	—	—	88	53	Остатокъ образовался въ виду удешевленія работъ и матеріаловъ.
Тоже.	Тоже.	883	40	—	—	—	—	133	51	Израсходовано: въ 1911 г. . 8533 р. 09 к. » 1912 г. . 883 р. 40 к. Итого . 9416 р. 49 к.
Тоже.	Не окончена.	—	—	2727	56	—	—	—	—	Остатокъ образовался въ виду удешевленія стоимости работъ и матеріала.
Тоже.	Окончена, но не принята.	—	—	4814	03	883	41	—	—	Работы въ 1912 г. не производились заготовлена часть лѣсного матеріала.
—	—	—	—	964	90	—	—	35	10	Перерасходъ получился вслѣдствіе вздорожанія цѣнъ на камень и дополнительныхъ противъ проекта работъ.
—	—	—	—	540	74	—	—	5	54	
—	—	883	40	10178	08	883	41	262	68	
		11061 р. 48 к.				—620 р. 73 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
Дмитровский уѣздъ.								
<i>Большой Кіевскій трактъ.</i>								
13	Рабочій водоспускъ при мельницѣ на Княжьей гати съ переѣзднымъ мостикомъ черезъ него	3,00	3,00	0,60	1843	21	94	61
<i>Съясско-Карачевскій трактъ.</i>								
53	Вблизи хутора „Гремучій“ земляная балластированная пескомъ гать и деревянный мостъ при ней.				650	—	650	—
	Гать	55,00	3,50	0,60				
	Мостъ	5,00	2,67	0,75				
<i>Дмитровско-Карачевскій трактъ.</i>								
59	При селѣ Сусловѣ земляная балластированная пескомъ гать и деревянный мостъ при ней.				1600	—	1600	—
	Гать	50,00	3,50	0,50				
	Мостъ	11,50	3,00	1,60				
<i>Отдѣльный пунктъ.</i>								
60	Черезъ р. Большую Локню вблизи деревни Рублиной, земляная балластированная пескомъ гать и деревянный мостъ при ней.				2750	—	2750	—
	Гать	55,00	3,50	1,20				
	Мостъ	18,50	3,00	1,20				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1912 г., но не принята.	79	66	—	—	—	—	14	95	<p>Израсходовано:</p> <p>Въ 1911 г . 827 р. — к.</p> <p>» 1912 г . 79 р 66 к.</p> <hr/> <p>Итого . 906 р. 66 к.</p> <p>Остальной расходъ 1912 г въ суммѣ 900 р. принялъ на себя владѣлецъ мельницы.</p>
Тоже.	Тоже.	—	—	571	52	—	—	78	48	Остатокъ образовался вслѣдствіе заготовки матеріала по болѣе низкимъ цѣнамъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	1433	84	—	—	166	16	Остатокъ образовался вслѣдствіе заготовки матеріала по болѣе низкимъ цѣнамъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	2607	83	—	—	42	17	Тоже.

№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	1500	—	1500	—
—	На оплату работъ 1911 г.	—	—	—	—	—	—	—
—	Наразѣзды Член. Уѣздовой Управы и 1% вознагражденія служащимъ канцеляріи .	—	—	—	—	—	504	10
Итого по Дмитровскому уѣзду .		—	—	—	8343	21	7098	71
Кромской уѣздъ.								
<i>Кромы-Михайловскій трактъ.</i>								
29	Въ с. Ломовцѣ устройство постоянного дубоваго моста черезъ р. Ракитню и мощеной гати къ нему.							
	Мостъ	14,00	2,67	1,60	4661	55	510	73
	Гать	87,00	4,00	1,60				
<i>Кромы-Сабуровская проселочная дорога.</i>								
37	Улучшеніе части тракта въ д. Ниж.-Каменецъ, устройствомъ постоянного дубоваго моста, черезъ р. Тросну.							
	Мостъ	18,00	2,67	2,20	5608	20	1082	01
	Мощеніе	120,00	2,00	—				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 г.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	—	—	—	1063	40	—	—	436	60	
—	—	8	—	—	—	8	—	—	—	
—	—	—	—	494	16	—	—	9	94	
—	—	87	66	6170	75	8	—	748	30	
		6258 р. 41 к.				+740 р. 30 к.				
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1911 г. и принята 4-го іюля 1912 г.	244	87	—	—	—	—	265	86	
Гоже.	Гоже.	1127	35	—	—	45	34	—	—	

Израсходовано:

Въ 1908 г. . 1350 р. — к.

» 1909 г. . 1732 р. 43 к.

» 1910 г. . 290 р. 50 к.

» 1911 г. . 777 р. 89 к.

» 1912 г. . 244 р. 87 к.

Итого . 4395 р. 69 к.

Остатокъ получился вслѣдствіе заготовки матеріала хозяйственнымъ путемъ.

Израсходовано:

Въ 1910 г. . 1820 р. 9 к.

» 1911 г. . 2705 р. 27 к.

» 1912 г. . 1127 р. 35 к.

Итого . 5653 р. 54 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовать въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
38	Кромь-Красниковская проселочная дорога.							
	Улучшение части тракта въ дер. Шарыкиной устройствомъ постоянного дубоваго моста черезъ р. Тешимку.							
	Мостъ	14,00	2,67	3,35	} 5462 31	889 66		
	Моцение	140,00	2,00	—				
48	Подгъздной путь изъ гор. Кромъ къ ст. Дьячье.							
	Въ с. Ретяжахъ, устройство постоянного дубоваго моста земляной гати къ нему и укрѣпленіе берега рѣки.							
	Мостъ	12,50	2,67	2,60	} 5448 11	5448 11		
	Гать	94,00	4,00	—				
49	На оврагѣ „Малтычъ“ устройство постоянного дубоваго моста и моцение гати.							
	Мостъ	12,00	2,67	0,90	} 3773 86	3773 86		
	Гать	44,00	4,00	—				
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	—	—	4381 90	
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы 1% вознагражденія служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	499 —	
	Итого по Кромскому уѣзду	—	—	—	24954 03	16585 27		

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1911 г. и принята 4 іюля 1912 г.	774 40	—	—	—	—	—	115 26		Израсходовано: Въ 1910 г. . . 1952 р. 30 к. » 1911 г. . . 2620 р. 35 к. » 1912 г. . . 774 р. 40 к. <hr/> Итого . 5347 р. 05 к.
Тоже.	Окончена и принята 21 августа 1912 г.	—	—	3097 37	—	—	—	2350 74		Остатокъ получился вслѣдствіе хозяйственной заготовки матеріала и не сдѣланнаго моцения гати.
Тоже.	Тоже.	—	—	1926 51	—	—	—	1847 35		Остатокъ получился вслѣдствіе не сдѣланнаго моцения гати.
—	—	—	—	4314 07	—	—	—	67 83		
—	—	—	—	511 34	12	34	—	—		
—	—	2146 62	9849 29	57 68	4647 04					
		11995 р. 91 к.	+4589 р. 36 к.							

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	Малоархангельскій уѣздъ.							
	<i>Подъездной путь отъ г. Малоархангельска къ ст. Малоархангельскъ М.-К. ж. д.</i>							
35	Замощеніе дороги по дер. Вавилоновкѣ.							
	Мощеніе	340,00	2,50	—	13681	90	—	—
	Деревянная труба.	1,33	3,00	0,50				
	Подъездные мостики 2 по	1,33	2,66	0,35				
	Подъездные мостики 4 по	1,33	1,50	0,35				
	Подъездные мостики 8 по	1,33	1,33	0,35				
35 ^a	Замощеніе дороги у дер. Гриневки со стороны гор. Малоархангельска.							
	Мощеніе	250,00	2,00	—	5751	84	5751	84
36	Планировка дороги между д. Гриневкой и с. Протасовымъ.							
	Планировка	550,00	10,00	—	2037	92	1637	92
	Переѣздные мостики 2 по	1,33	2,66	0,35				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Смѣшаннымъ.	Окончена, но не принята.	482	20	—	—	—	—	1757	65	Израсходовано: въ 1909 г. . 3389 р. 76 к. » 1910 г. . 6940 р. 59 к. » 1911 г. . 1111 р. 70 к. » 1912 г. . 482 р. 20 к. Итого 11924 р. 25 к. Остатокъ объясняется не уплатой за отчужденіе земли
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	1000	—	—	—	—	—	
Смѣшаннымъ.	Тоже.	791	65	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1911 г. . 400 р. — к. » 1912 г. . 791 р. 65 к. Итого . 1191 р. 65 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	7726	52	7726	52
	На разѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1% вознагражденія служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	694	05
	Итого по Малоархангельскому уѣзду	—	—	—	29198	18	15810	33
	Ливенскій уѣздъ. <i>Ливенско-Воронежскій трактъ.</i>							
13	Постройка каменной трубы, подпорной стѣнки и мостовая въ с. Жерино. Труба Мощеніе	1,20 104,80	7,50 2,00	1,50 —	4651 17		—	—
59	Исправленіе существующей трубы и мостовой въ „Соколомъ верху“. Труба Мостовая	1,60 140,00	4,20 2,50	1,30 —	2947 52		2947	52
16	Исправленіе существующей трубы и замощеніе дороги и кюветовъ на оврагѣ „Ржавецъ“. Труба Мощеніе Кюветы	3,80 260,00 260,00	3,60 2,25 1,25	1,30 — —	4891 75		4891	75

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	3061	78	—	—	4664	74	
—	—	—	—	454	06	—	—	239	99	
—	—	1273	85	4515	84	—	—	6662	38	
		5789 р. 69 к.								
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г.	20	45	—	—	—	—	1897	—	Израсходовано: въ 1911 г. . 4611 р. 75 к. > 1912 г. . 20 р. 45 к. Итого . 4632 р. 20 к.
Тоже.	Окончена въ 1912 г.	—	—	3084	40	136	88	—	—	Израсходовано: въ 1912 г. . 3084 р. 40 к. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе увеченія каменныхъ работъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	4609	15	—	—	282	60	Израсходовано: въ 1912 г. . 4609 р. 15 к. Сбереженіе получило вслѣдствіе болѣе дешевой покупки камня.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженихъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
71	Укрѣпленіе оврага каменной подпорной стѣнкой съ мощеными лотками „въ Овсянниковомъ верху“.							
	Стѣнка	9,50	0,40 1,20	2,00	} 2272	—	—	—
	Лотки	40,00	1,5 и 2,00	—				
	<i>Московско-Ливенскій трактъ.</i>							
42	Исправленіе существующей трубы на 4-й верстѣ въ верху „Славномъ“.							
	Труба	1,10	3,00	1,30	} 741 49	741	49	
	Мощеніе	52,00	2,00	—				
	<i>Ливенско-Новосильскій трактъ.</i>							
41	Постройка моста на желѣзо-бетонныхъ устояхъ съ желѣзо-бетоннымъ перекрытіемъ въ дер. „Березовецъ“.							
	Мостъ	2,60	3,00	2,90	3049	62	3049	62
	<i>Ливенско-Острогожскій трактъ.</i>							
44	Постройка двухъ мостовъ съ мощеными подѣздами на 38 верстѣ.							
	Мосты № I и II	2,10	2,67	0,60	} 1090	64	1090	64
	Мощеніе	40,00	2,00	—				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На работы 1912 года.		Перерасходъ.	Сбереженіе.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.			РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ	Окончена въ 1911 г.	4	50	—	—	—	—	178	80	Израсходовано: въ 1911 г. . 2088 р. 70 к. » 1912 г. . . 4 р. 50 к. Итого . 2093 р. 20 к.
Тоже.	Окончена въ 1912 г.	—	—	719	78	—	—	21	71	Израсходовано: въ 1912 г. . 719 р. 78 к.
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1912 г.	—	—	3440	85	391	23	—	—	Израсходовано: въ 1912 г. . 3440 р. 85 к. Перерасходъ произошелъ вследствие устройства желѣзо-бетоннаго перекрытія взаимѣнь деревяннаго.
	Не окончена.	—	—	100	—	—	—	—	—	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
4	<i>Ливенско-Елецкій трактъ.</i>							
	Укрѣпленіе оврага каменной подпорной стѣнкой съ мощеными лотками около имѣнія г. Вульфа.		0,40					
	Стѣнка	11,40	1,40	2,80	} 2698 15	—	—	—
	Лотки	60,00	1,50 и 20	—				
32	<i>Подъездной путь изъ с-ца Набережнаго къ ст. Набережной Ю. В. жел. дор.</i>							
	Мощеніе насыпи около существующаго моста близъ ст. Набережной.							
	Мощеніе	116,00	2,00	—	1084 88	1084 88		
36 ^б	<i>Подъездной путь къ подъездному пути изъ с. Долгаго къ станціи Долгой М. К. В. ж. дороги.</i>							
	Постройка дубоваго моста заливной системы черезъ р. Тимъ съ каменными плечами и мощеными выѣздами въ с. Нижне-Долгомъ.							
	Мостъ	33,10	3,40	—	} 5637 25	5637 25		
	Мощеніе	22,00	2,25	—				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или поряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 г.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственнымъ.	Окончена въ въ 1911 г.	30	25	—	—	138 86	—	—		<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1910 г. . . 420 р. 89 к.</p> <p>> 1911 г. . . 2385 р. 87 к.</p> <p>> 1912 г. . . 30 р. 25 к.</p> <p>Итого . 2837 р. 01 к.</p> <p>Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе укладки коркаса и большого количества цемента.</p>
Поряднымъ.	Окончена въ 1912 г.	—	—	901 50	—	—	—	183 38		<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1912 г. . . 901 р. 50 к.</p> <p>Остатокъ произошелъ вслѣдствіе дешевой сдачи работъ.</p>
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1912 г.	—	—	6815 17	1677 92	—	—			<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1911 г. . . 500 р. — к.</p> <p>> 1912 г. . . 6815 р. 17 к.</p> <p>Итого . 7315 р. 17 к.</p> <p>Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе поврежденія моста во время производства работъ.</p>

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено израсходовать въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
34 ^a	Подъездной путь къ подъездному пути изъ с. Борокъ къ ст. Тербуны Ю. В. ж. д.							
	Постройка дубоваго моста черезъ р. Курганку съ мощеными выѣздами въ д. Курганкѣ.							
	Мостъ	15,00	2,67	1,00	2546	98	2546	98
Мощеніе	42,00	2,25	—					
Кюветы	43,00	1,00	—					
35 ³	Подъездной путь изъ с-ца Васильевского къ ст. Тербуны Ю. В. ж. д.							
	Постройка дубоваго моста съ мощеными выѣздами въ с-цѣ Дмитріевскомъ.							
	Мостъ	7,00	2,67	—	2158	97	2158	97
Мощеніе	60,00	2,50	—					
--	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	6699	20	6699	20
—	На разѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 ⁰ / ₁₀₀ вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	740	44
	Итого по Ливенскому уѣзду . . .	—	—	—	57577	53	45734	87

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1912 г.	—	—	2532	45	—	—	14	53	Израсходовано: въ 1912 г. . 2532 р. 45 к.
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	—	—	1787	61	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1912 г. . 1787 р. 61 к. Не произведены мостовыя работы.
—	—	—	—	6762	21	63	01	—	—	
—	—	—	—	370	82	—	—	369	62	
—	—	73	20	45053	94	2415	50	1285	74	
		45127 р. 14 к.				—1129 р. 76 к.				

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техни-ческимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходо-ванію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Елецкій уѣздъ.								
<i>Старооскольскій трактъ.</i>								
106	Капитальное переустрой-ство Лавскаго шоссе съ про-изводствомъ сплошной роз-сыпи щебня на всемъ про-тяженіи	840,00	3,00	—	2858	48	2858	48
<i>Лебедянский трактъ.</i>								
107	Капитальное переустрой-ство моста въ деревнѣ Тру-бициной черезъ р. Пальну.							
	Мостъ	8,60	3,00	2,45	2472	55	2472	55
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	—	—	5000	—
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 ⁰ / ₀ воз-награжденіе служащимъ кан-целяріи	—	—	—	—	—	718	37
Итого по Елец-кому уѣзду . . .		—	—	—	5331	03	11049	40
Итого по литерѣ А.		—	—	—	247488	22	179189	79

Какимъ способомъ про-изводилась ра-бота хозяй-ственнымъ или подряд-нымъ.	Когда работа окон-чена, осмотрѣ-на, или при-нята Губер-скимъ Зем-ствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На оконча-ніе и про-долженіе ра-ботъ преж-нихъ лѣтъ.		На работы 1912 г.		Перерас-ходъ.		Сбереже-ніе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйствен.	Не окончена	—	—	2875	93	17	45	—	—	
Тоже.	Окончена, но не принята.	—	—	2880	48	407	93	—	—	Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе потребовавшейся въ большомъ количествѣ за-мѣны камней въ облицовкѣ.
—	—	—	—	3116	56	—	—	1883	44	
—	—	—	—	718	37	—	—	—	—	
—	—	—	—	9591	34	425	38	1883	44	
										+1458 р. 06 к.
—	—	25465	20	135060	71	12149	91	22607	94	
										+10458 р. 03 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	Б. Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно Орловскою Губернскою Земскою Управою.							
	Орловскій уѣздъ.							
	<i>Орловско-Болховской трактъ.</i>							
73	У деревни Роспоповой построена мощеная гать и дубовый мостъ		4 ^{1/2}					
	Гать	33,00	2	—	613	10	613	10
	Мостъ	2,33	2,67	0,66				
	<i>Подъездной путь къ ст. Зміевка М.-К. жел. дор.</i>							
21	Устройство деревяннаго моста и мощеной гати въ д. Алисовой		3 ^{1/2}					
	Гать	210	2	—	4551	06	3998	80
	Мостъ	12	2,67	1				
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	3500	—	3500	—
	Итого по Орловскому уѣзду . . .	—	—	—	8664	16	8111	90

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа окончена, но не принята	—	—	572	60	—	—	40	50	
Гоже.	Работа не окончена.	289	25	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2930	05	—	—	569	95	
—	—	289	25	3502	65	—	—	610	45	
		3791 р. 90 к.								

Израсходовано:
 Въ 1911 г. . 552 р. 26 к.
 » 1912 г. . 289 р. 25 к.
 Итого . 841 р. 51 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
65	Мценскій уѣздъ.							
	<i>Орловско-Новосильскій трактъ.</i>							
	Построенъ постоянный деревянный по системѣ инженера Лембке, мостъ на каменныхъ опорахъ съ мощеными въѣздами въ с. Домнинѣ							
	Мостъ	15,00	3,00	3,77	17153	85	400	—
	Въѣзды	260,00	2—3	3,77				
	Итого по Мценскому уѣзду	—	—	—	17153	85	400	—
	Волховской уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооруженій	—	—	—	1600	—	1600	—
	Итого по Волховскому уѣзду	—	—	—	1600	—	1600	—
	Карачевскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооруженій	—	—	—	700	—	700	—
	Итого по Карачевскому уѣзду	—	—	—	700	—	700	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подрядн.	Окончена и принята въ 1911 году.	400	—	—	—	1463	20	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 10452 р. 97 к. » 1911 г. . 7764 р. 08 к. » 1912 г. . 400 р. — к. Итого . 18617 р. 05 к. *) Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе постройки моста на другомъ мѣстѣ, въ связи съ прорытіемъ новаго русла; облицовки устоевъ крѣпкимъ тесаннымъ камнемъ, въ виду значительнаго ледохода; большого расхода на отливку воды изъ котловановъ подъ устои, и сверхсмѣтной работы по планировкѣ земляного полотна дороги.
—	—	400	—	—	—	1463	20	—	—	
—	—	—	—	935	52	—	—	664	48	
—	—	—	—	935	52	—	—	664	48	
—	—	—	—	763	57	63	57	—	—	
—	—	—	—	763	57	63	57	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	Брянскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	300	—	300	—
	Итого по Брянскому уѣзду . .	—	—	—	300	—	300	—
	Трубчевскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	300	—	300	—
	Итого по Трубчевскому уѣзду .	—	—	—	300	—	300	—
	Сѣвскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	700	—	700	—
	Итого по Сѣвскому уѣзду . .	—	—	—	700	—	700	—
	Дмитровскій уѣздъ.							
	Подъездной путь къ станціи Комаричи М.-К.-В. ж. д.							
19 ^д	Замощеніе подъездного пути къ ст. Комаричи М.-К.-В. ж. д.							
	Замощеніе	300,00	4,00 2,00	—	5000	—	5000	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	—	—	—	725	—	425	—	—	—	
—	—	—	—	725	—	425	—	—	—	
—	—	—	—	8	—	—	—	292	—	
—	—	—	—	8	—	—	—	292	—	
—	—	—	—	594	48	—	—	105	52	
—	—	—	—	594	48	—	—	105	52	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	5084	60	84	60	—	—	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техни- ческимъ смѣтамъ ис- числено на работы.		Предположе- нъ израсхо- дованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	1200	—	1200	—
	Итого по Кром- скому уѣзду	—	—	—	11849	06	3251	16
	Малоархангельскій уѣздъ.							
	<i>Подгъздной путь къ станціи Малоархангельскъ М - К ж. д.</i>							
12	Мошеніе полотна дороги у ст. Малоархангельскъ въ предѣлахъ Орловскаго уѣзда.							
	Мошеніе	2 вер.	4,00 2,50	—	23100	—	5000	—
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений.	—	—	—	2800	—	2800	—
	Итого по Малоар- хангельскому уѣзду	—	—	—	25900	—	7800	—
	Ливенскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	1200	—	1200	—
	Итого по Ливен- скому уѣзду	—	—	—	1200	—	1200	—

Какимъ способомъ про- изводилась ра- бота, хозяй- ственнымъ или подряд- нымъ.	Когда работа окон- чена, осмотрѣ- на, или при- нята Губер- нскимъ Зем- ствомъ.	Израсходовано въ 1912 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На оконча- ніе и про- долженіе ра- ботъ преж- нихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерас- ходъ.		Сбереже- ніе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	—	—	—	724	85	—	—	475	15	
—	—	1698	29	724	85	675	46	1256	17	
		2423 р. 14 к.				+580 р. 71 к.				
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	1171	75	—	—	—	—	
—	—	—	—	1814	40	—	—	985	60	
—	—	—	—	2986	15	—	—	985	60	
—	—	—	—	1033	18	—	—	166	82	
—	—	—	—	1033	18	—	—	166	82	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1912 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
	Елецкій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	300	—	300	—
	Итого по Елецкому уѣзду	—	—	—	300	—	300	—
	Администрація	—	—	—	—	—	30977	75
	Итого по лит. Б.	—	—	—	76267	07	63240	81
	Всего по лит. А. и Б.	—	—	—	323755	29	242430	60

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1912 г				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1912 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	4	10	—	—	295	90	
—	—	—	—	4	10	—	—	295	90	
—	—	—	—	31042	17	64	42	—	—	
—	—	238754	48619	75	2776	25	5761	46		
		51007	р. 29	к.	2985	р. 21	к.			
—	—	27852	74	183680	46	14926	16	28369	40	
		211533	р. 20	к.	+13443	р. 24	к.			

No.	Name	Rank	Remarks
1	John Smith	Private	Discharged
2	James Brown	Private	Discharged
3	William Jones	Private	Discharged
4	Robert Taylor	Private	Discharged
5	Thomas White	Private	Discharged
6	George Black	Private	Discharged
7	Charles Green	Private	Discharged
8	Richard King	Private	Discharged
9	Henry Hill	Private	Discharged
10	Samuel Adams	Private	Discharged
11	Nathan Baker	Private	Discharged
12	Nathan Baker	Private	Discharged
13	Nathan Baker	Private	Discharged
14	Nathan Baker	Private	Discharged
15	Nathan Baker	Private	Discharged
16	Nathan Baker	Private	Discharged
17	Nathan Baker	Private	Discharged
18	Nathan Baker	Private	Discharged
19	Nathan Baker	Private	Discharged
20	Nathan Baker	Private	Discharged
21	Nathan Baker	Private	Discharged
22	Nathan Baker	Private	Discharged
23	Nathan Baker	Private	Discharged
24	Nathan Baker	Private	Discharged
25	Nathan Baker	Private	Discharged
26	Nathan Baker	Private	Discharged
27	Nathan Baker	Private	Discharged
28	Nathan Baker	Private	Discharged
29	Nathan Baker	Private	Discharged
30	Nathan Baker	Private	Discharged
31	Nathan Baker	Private	Discharged
32	Nathan Baker	Private	Discharged
33	Nathan Baker	Private	Discharged
34	Nathan Baker	Private	Discharged
35	Nathan Baker	Private	Discharged
36	Nathan Baker	Private	Discharged
37	Nathan Baker	Private	Discharged
38	Nathan Baker	Private	Discharged
39	Nathan Baker	Private	Discharged
40	Nathan Baker	Private	Discharged

Общій сводъ

РАСХОДОВЪ ПО СУММАМЪ ДОРОЖНАГО КАПИТАЛА

за 1912 годъ.

Наименование уѣздовъ.	По техниче- скимъ смѣ- тамъ нечис- лено на ра- боты.		Предположено израсходовать въ 1912 году.									
			На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и при- нятыхъ со- оруженій.		На содержа- ніе админи- страціи до- рожнаго от- дѣла, канце- ляріи и пр.		В С Е Г О.	
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
А. П о у ѣ з д												
Орловскій	26107	67	1900	—	4109	66	6200	—	711	17	12920	83
Мценскій	22174	06	—	—	3360	—	5400	—	533	72	9293	72
Болховской	9881	91	—	—	3373	86	3383	45	515	25	7272	56
Карачевскій	11906	64	3353	38	6963	25	3000	—	533	20	13849	83
Брянскій	16150	31	4110	37	3445	50	4034	44	1071	31	12661	62
Трубчевскій	14813	65	851	59	8831	32	3630	05	536	50	13849	46
Сѣвскій	21050	—	1016	91	10500	—	1000	—	546	28	13063	19
Дмитровскій	8343	21	94	61	5000	—	1500	—	504	10	7098	71
Кромской	24954	03	2482	40	9221	97	4381	90	499	—	16585	27
Малоархангельскій	29198	18	1637	92	5751	84	7726	52	694	05	15810	33
Ливенскій	57577	53	—	—	38295	23	6699	20	740	44	45734	87
Елецкій	5331	03	—	—	5331	03	5000	—	718	37	11049	40
Итого по лит. А	247488	22	15447	18	104183	66	51955	56	7603	39	179189	79
Б. П о г у б е р н												
Орловскій	8664	16	3998	80	613	10	3500	—	—	—	8011	90
Мценскій	17153	85	400	—	—	—	—	—	—	—	400	—
Болховской	1600	—	—	—	—	—	1600	—	—	—	1600	—
Карачевскій	700	—	—	—	—	—	700	—	—	—	700	—
Брянскій	300	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300	—
Трубчевскій	300	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300	—
Сѣвскій	700	—	—	—	—	—	700	—	—	—	700	—
Дмитровскій	7600	—	—	—	5000	—	2600	—	—	—	7600	—
Кромской	11849	06	2051	16	—	—	1200	—	—	—	3251	16
Малоархангельскій	25900	—	—	—	5000	—	2800	—	—	—	7800	—
Ливенскій	1200	—	—	—	—	—	1200	—	—	—	1200	—
Елецкій	300	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300	—
Администрація	—	—	—	—	—	—	—	—	30977	75	30977	75
Итого по лит. Б	76267	07	6449	96	10613	10	15200	—	30977	75	63240	81
Всего по лит. А и Б	323755	29	21897	14	114796	76	67155	56	38581	14	242430	60

Израсходовано въ 1912 году.								Противъ техни- ческихъ смѣтъ.				Примѣчаніе.		
На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и при- нятыхъ со- оруженій.		На содержа- ніе админи- страціи до- рожнаго от- дѣла, канце- ляріи и пр.		В С Е Г О.		Перерасходъ.			Сбереженіе.	
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		Руб.	К.
н о й ч а с т и.														
3115	26	1429	42	7192	07	745	81	12482	56	—	—	637	51	
901	22	4818	02	5218	43	543	55	11481	22	—	—	31	83	
—	—	5013	02	5730	14	410	46	11153	62	3904	88	—	—	
1579	17	9585	93	78	96	546	84	11790	90	—	—	2043	68	
2683	93	2500	—	4420	19	1085	39	10689	51	663	53	—	—	
362	82	8714	51	3494	77	532	03	13104	13	—	—	613	81	
883	40	8672	44	964	90	540	74	11061	48	620	73	—	—	
87	66	4613	19	1063	40	494	16	6258	41	—	—	740	30	
2146	62	5023	88	4314	07	511	34	11995	91	—	—	4589	36	
1273	85	1000	—	3061	78	454	06	5789	69	—	—	6662	38	
73	20	37920	91	6762	21	370	82	45127	14	1129	76	—	—	
—	—	5756	41	3116	56	718	37	9591	34	—	—	1458	06	
13107	13	95047	73	45417	48	6953	57	160525	91	6318	90	16776	93	
												+10458 р. 03 к.		
с к о й ч а с т и.														
289	25	572	60	2930	05	—	—	3791	90	—	—	610	45	
400	—	—	—	—	—	—	—	400	—	1463	20	—	—	
—	—	—	—	935	52	—	—	935	52	—	—	664	48	
—	—	—	—	763	57	—	—	763	57	63	57	—	—	
—	—	—	—	725	—	—	—	725	—	425	—	—	—	
—	—	—	—	8	—	—	—	8	—	—	—	292	—	
—	—	—	—	594	48	—	—	594	48	—	—	105	52	
—	—	5084	60	1215	48	—	—	6300	08	—	—	1299	92	
1698	29	—	—	724	85	—	—	2423	14	—	—	580	71	
—	—	1171	75	1814	40	—	—	2986	15	—	—	985	60	
—	—	—	—	1033	18	—	—	1033	18	—	—	166	82	
—	—	—	—	4	10	—	—	4	10	—	—	295	90	
—	—	—	—	—	—	31042	17	31042	17	64	42	—	—	
2387	54	6828	95	10748	63	31042	17	51007	29	2016	19	5001	40	
												+2985 р. 21 к.		
15494	67	101876	68	56166	11	37995	74	211533	20	8335	09	21778	33	
												+13443 р. 24 к.		

