

12

К65.37
О-88

ОТЧЕТЪ

ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

О РАСХОДАХЪ,


произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Правительствомъ Орловскому
Губернскому Земству шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи

за 1897 годъ.


ОРЕЛЪ.

Типографія С. А. Зайцевой.

1898.

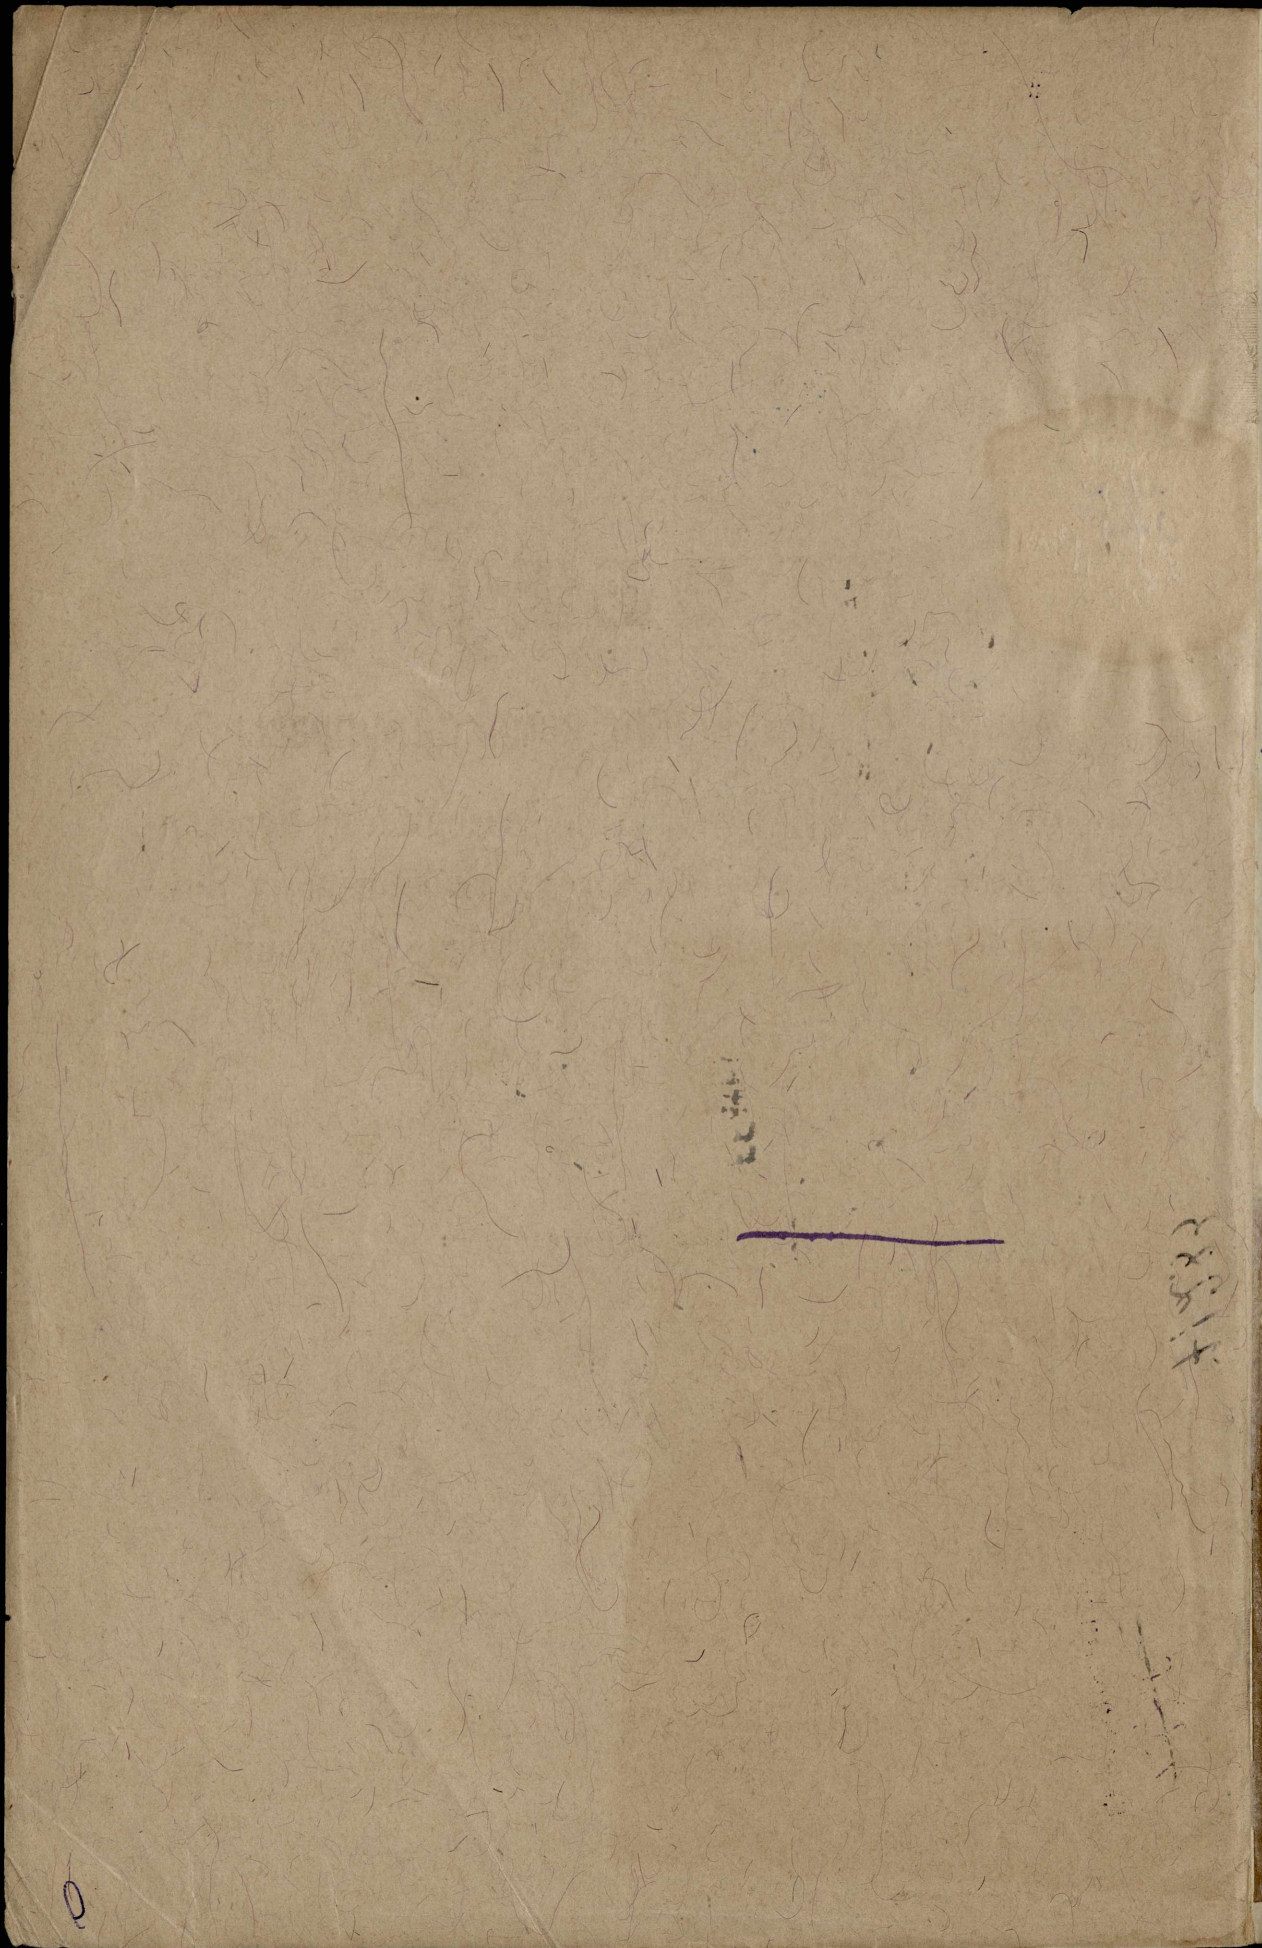

к 65,37 ✓
0-88



КР-2017

71283

ОТЧЕТЪ

Орловской губернской земской управы


о расходахъ, произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Правительствомъ Орловскому Губернскому Земству шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи

за 1897 годъ.

Учет
Библиотеки
1938 г.

КРАЕВЕДЕНИЕ
2009

КНИГОХРАНИЛИЩЕ



ОРЕЛЬ.

Типографія С. А. Зайцевой.

1898.

ПРОВЕРЕНО
1946 г.

Печатать дозволено.

Пояснительная записка

къ отчету по ремонтному содержанию переданныхъ земству Орловской
губерніи казенныхъ шоссейныхъ дорогъ за 1897 годъ.

Приходъ въ 1897 году состоялъ изъ:

1) Субсидіи отъ правительства на 1897 г.	130550 р. —	к.
2) Случайныхъ поступленій	664 р. 72	к.
3) Шоссейнаго сбора	763 р. 77 ¹ / ₂	к.
Итого на приходъ . . .	131978 р. 49 ¹ / ₂	к.

Расходъ, произведенный въ 1897 году, состоялъ:

По статьямъ:

Статья 1-я. На матеріалы	31943 р. 26	к.
Статья II-я. На ремонтныя работы	24274 р. 72	к.
Статья III-я. На мосты, зданія и дорожныя сооруженія .	18408 р. 88	к.
Статья IV-я. На администрацію	28104 р. 94	к.
На расходы по приѣмкѣ шоссе въ 1896 г.	4314 р. 11	к.
Итого въ расходъ . . .	107045 р. 91	к.

Оборотъ суммъ:

I) Ремонтныя суммы (Правительственная субсидія)

Поступило	130550 р. —	к.
Израсходовано	107045 р. 91	к.
Остатокъ	23504 р. 09	к.

II) Случайныя поступления.

Поступило	664 р. 72 к.
Израсходовано	— р. — к.
Остатокъ	664 р. 72 к.

III) Шоссейный сборъ.

Поступило	763 р. 77 ¹ / ₂ к.
Израсходовано	741 р. 83 к.
Остатокъ	21 р. 94 ¹ / ₂ к.

А всего остатка (23504 р. 09 + 664 р. 72 к. + 21 р. 94¹/₂ к.) = 24190 р. 75¹/₂ к.

Предсѣдатель управы *С. Хвостовъ.*


Члены: { *Римскій-Корсаковъ.*
Разуваевъ.
Потуловъ.

Старшій инженеръ *Лукомскій*

Отчетная вѣдомость

съ показаніемъ характера шоссе и расходовъ на содержаніе онаго.

За 1897 годъ.

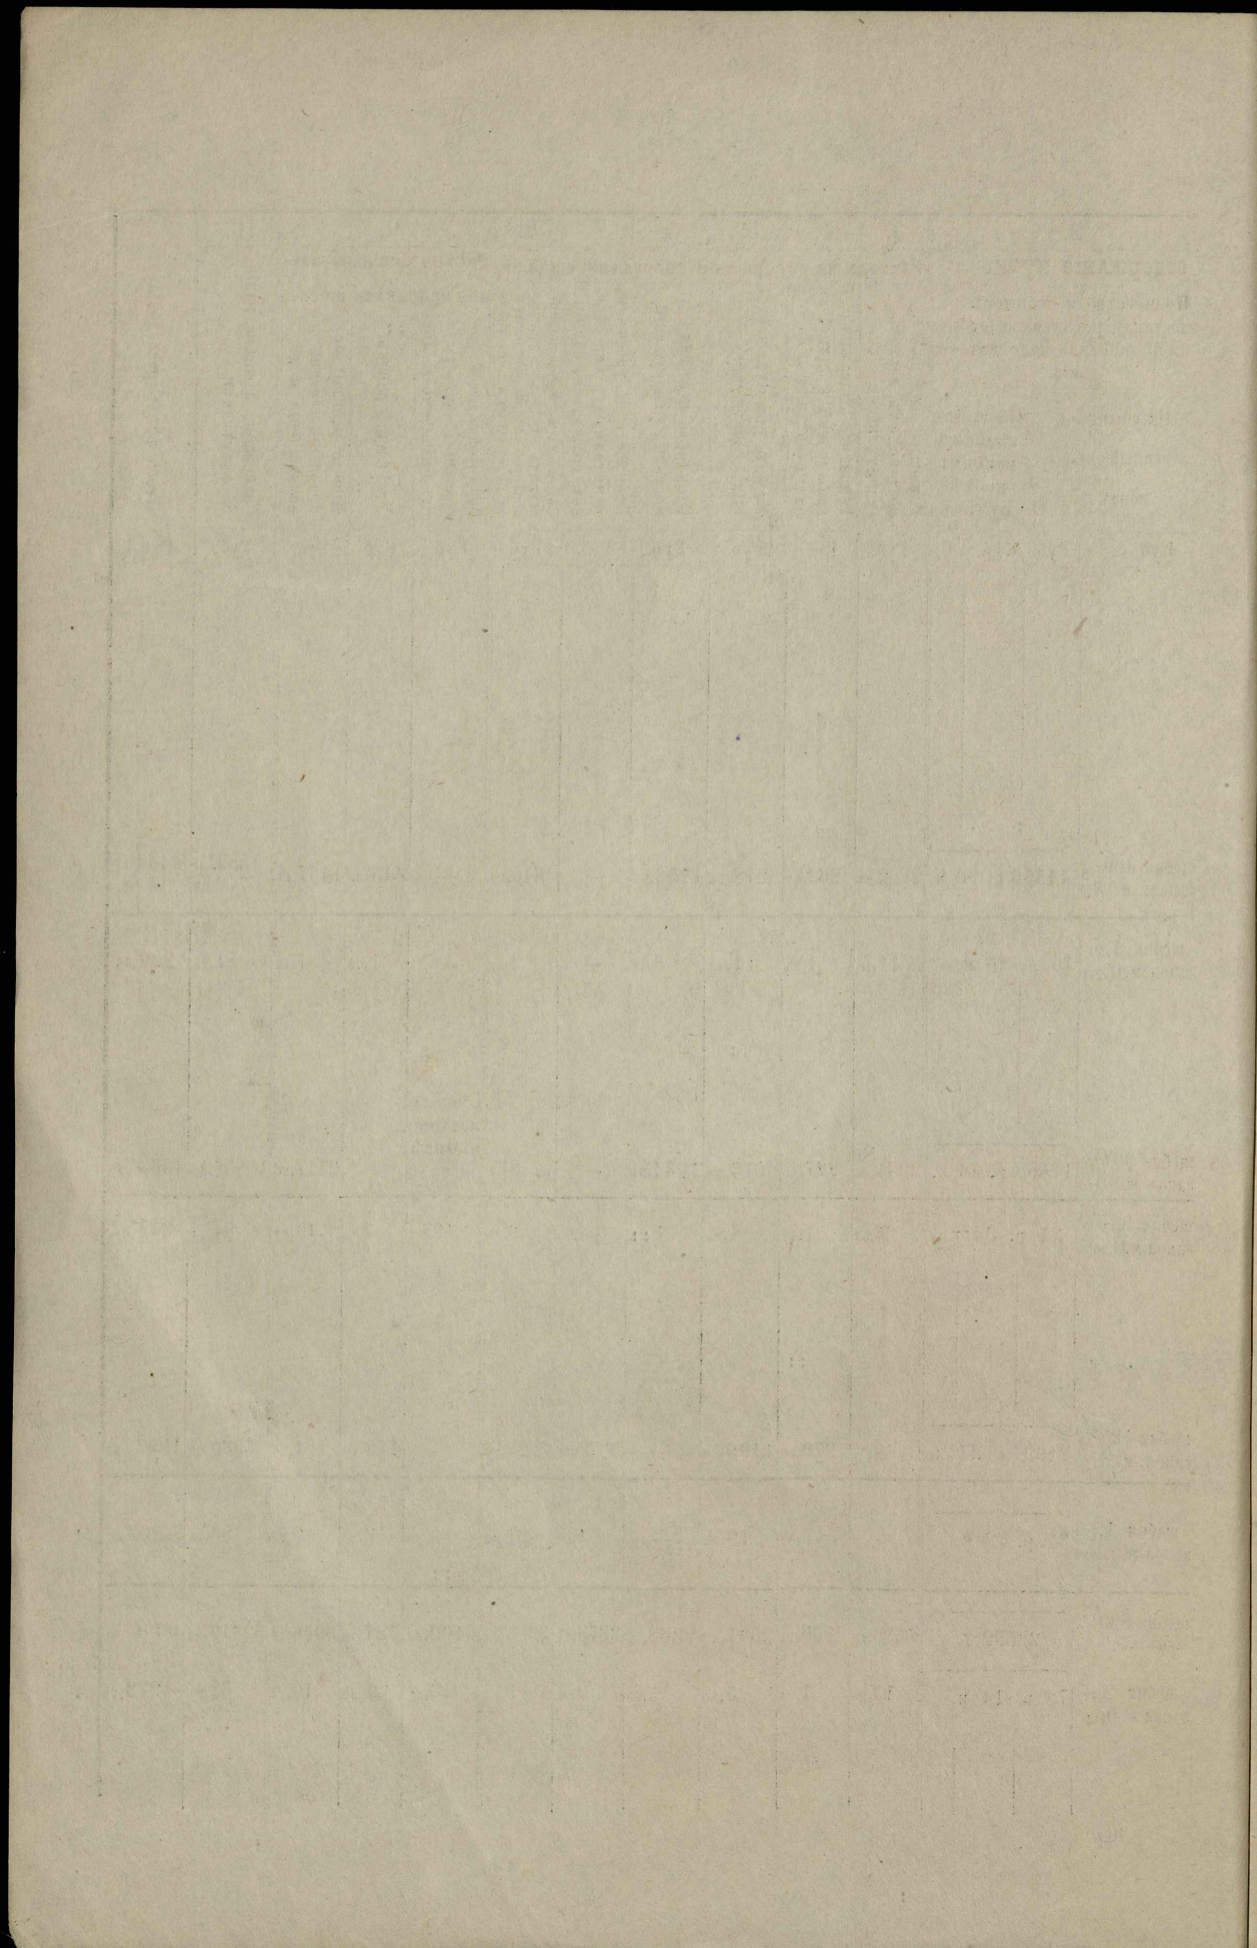

ОБЩІЙ СВОДЪ

расходовъ на матеріалы, работы и администрацію, съ показаніемъ поверстной стоимости и смѣтнаго назначенія по всеѣмъ участкамъ шоссе Орловской губерніи

за 1897 годъ.

Наименованіе статей расхода.	I УЧАСТОКЪ Витебско-Орловское шоссе. 193,395 версть.						II УЧА Подольско-Харь 126,668					
	Смѣтное наз- наченіе.			Израсходовано.			Смѣтное наз- наченіе.					
	Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.	
		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.
Статья I-я. Ремонтные матеріалы.												
1) Камень для мостовыхъ:												
а) Известковый												
б) Булыжный.												
в) Обойный												
2) а) Щебень. куб. саж. .												
б) Камень для щебня. куб. саж. .												
3) а) Хворость для застилки слабыхъ мѣстъ куб. саж. .												
б) Хворость для дренажа куб. саж. .												
4) Песокъ и мелкій камень (заполняю- щій матеріалъ) для розсыпей. . . куб. саж. .												
5) Песокъ для мостовыхъ. куб. саж. .												
Итого по ст. I.												
Статья II-я. Ремонтныя работы.												
А) Работы обыкновеннаго ремонта.												
1) Зимнія работы (съ 16 ноября по 16 марта).												
а) На сдѣланіе на обрѣзахъ защитъ изъ снѣга (валики) съ поправкою ихъ пог. саж. .												
б) Для содержанія зимой въ исправности профѣжей полосы до 2С. ширины, для срубанія раскатовъ и расчистки снѣговыхъ заносовъ												
Итого.												
2) Весеннія работы (съ 16 марта по 1 мая).												
а) Для очистки отъ снѣга шоссеиныхъ канавъ, а также отверстій трубъ и мостовъ												


СТОКЪ ковское шоссе версть.			III УЧАСТОКЪ Воронежское шоссе 70,920 версть.						Всего по шоссе 390,983 версты.						Средние выводы расходовъ на одну версту по всему шоссе.			
Израсходовано.			Смѣтное наз- наченіе.		Израсходовано.				Смѣтное наз- наченіе.		Израсходовано.							
Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		
	Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.	
30	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	690	—	0,077	1	76		
21,85	2127	50	—	—	—	—	—	—	—	—	21,85	2127	50	0,056	5	44		
—	—	—	—	—	—	5	58	70	—	—	—	5	58	70	}	2,19	72	11
394 ⁵ / ₈	11063	52	—	2000	—	125 ² / ₈	2383	57	—	27000	—	829 ¹ / ₈	27759	25				
18 ² / ₈	370	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 ² / ₈	370	50				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 ⁷ / ₁₆	134	82	—	100	—	4 ¹ / ₂	27	—	—	1225	—	54 ¹⁵ / ₁₆	403	56	0,141	1	03	
152 ¹ / ₂	533	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152 ¹ / ₂	533	75	0,39	1	37	
—	14920	09	—	2100	—	—	2469	27	—	28425	—	—	31943	26	—	81	71	
—	147	20	—	300	—	800	26	50	—	1060	—	—	184	65	—	—	47	
—	1008	9	—	250	—	—	400	05	—	1250	—	—	2612	36	—	6	68	
—	1155	29	—	550	—	—	426	55	—	2310	—	—	2797	01	—	7	15	
—	329	30	—	250	—	—	89	52	—	1250	—	—	676	87	—	1	73	

Наименованіе статей расхода.	I УЧАСТОКЪ Витебско-Орловское шоссе 193,395 верстѣ.						II УЧА Подольско-Харь 126,668					
	Смѣтное наз- наченіе.			Израсходовано.			Смѣтное наз- наченіе.					
	Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.				
		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.			
Б) Работы капитальнаго ремонта.												
1) Дренажъ слабыхъ мѣстъ пог. саж. .	—	500	—	—	—	—	—	—	—	300	—	
2) Углубленіе канавъ	—	400	—	п. с. 3824	345	69	—	—	—	300	—	
3) Исправленіе весеннихъ поврежденій	—	—	—	—	1150	04	—	—	—	—	—	
4) Постройка мостовыхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого по ст. II Б.	—	900	—	—	1495	73	—	—	—	600	—	
Итого по ст. II	—	11549	—	—	9188	64	—	—	—	7369	—	
Статья III-я.												
Мосты, зданія и дорожныя сооруженія.												
А. М о с т ы.												
1) Перестройка мостовъ и трубъ	—	600	—	—	1253	86	—	—	—	1500	—	
2) Капитальный ремонтъ мостовъ и трубъ	—	6000	—	—	2162	28	—	—	—	2500	—	
3) Мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ	—	1500	—	—	278	25	—	—	—	1000	—	
4) Содержаніе переправы	—	—	—	1	287	39	—	—	—	—	—	
Итого по ст. III А.	—	8100	—	—	3981	78	—	—	—	5000	—	
Б) З д а н і я.												
1) Постройка вновь зданій ,	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	2000	—	
2) Ремонтъ зданій	—	1000	—	1	52	53	—	—	—	400	—	
3) Содержаніе зданій	—	—	—	—	209	50	—	—	—	—	—	
Итого по ст. III Б.	—	4000	—	—	262	03	—	—	—	2400	—	
В) Второстепенныя дорожныя сооруженія.												
1) Постройка и перестройка переѣздныхъ мостиковъ и трубъ черезъ канавы	—	200	—	4	79	24	—	—	—	300	—	
2) Предохранительныя тумбы и замѣняющія ихъ на- сажденія	—	500	—	—	—	—	—	—	—	800	—	

СТОКЪ ковское шоссе верстѣ.			III УЧАСТОКЪ Воронежское шоссе 70,920 верстѣ.						Всего по шоссе 390,983 верстѣ.						Средніе выводы расходовъ на одну версту по всему шоссе.	
Израсходовано.			Смѣтное наз- наченіе.		Израсходовано.		Смѣтное наз- наченіе.		Израсходовано.							
Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.			
	Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		
—	—	—	—	—	—	п. с.	—	—	—	800	—	—	—	—		
—	—	—	—	300	—	1821	182	10	—	1000	—	—	527	79		
—	2517	26	—	—	—	—	—	1	80	—	—	—	3669	10		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2517	26	—	300	—	—	183	90	—	1800	—	—	4196	89		
—	12133	69	—	3982	—	—	2952	39	—	22900	—	—	24274	72		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62		
—	1054	91	—	10000	—	—	—	—	—	12100	—	—	2308	77		
—	3234	45	—	1500	—	—	—	—	—	10000	—	—	5396	73		
—	613	99	—	693	—	—	1199	66	—	3193	—	—	2091	90		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	287	39		
—	4903	35	—	12193	—	—	1199	66	—	25293	—	—	10084	79		
—	—	—	—	—	—	1	3878	71	—	5000	—	1	3878	71		
2	156	29	—	200	—	1	108	52	—	1600	—	4	317	34		
2	71	12	—	—	—	2	162	18	—	—	—	—	442	80		
—	227	41	—	200	—	—	4149	41	—	6600	—	—	4638	85		
пер. м. 10 лотк. 1 насажд. 2548	312	30	}	—	200	—	—	17	10	—	700	—	}	408	64	
	188	91		—	—	—	—	—	—	—	—	188		91		
	168	49		—	700	—	т. 575 п. 4112	583	78	—	2000	—	—	752	27	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Наименование статей расхода.	I УЧАСТОКЪ Витебско-Орловское шоссе 193,395 верстъ.						II УЧА Подольско-Харь 126,668					
	Смѣтное наз- наченіе.			Израсходовано.			Смѣтное наз- наченіе.			Смѣтное наз- наченіе.		
	Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.	
		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.
3) Межевые и пограничные знаки	—	200	—	Меж. 650	272	63	—	200	—	—	—	—
4) Верстовые и сотенные знаки.	—	300	—	—	288	21	—	200	—	—	—	—
Старый лѣсной матеріалъ, купленный съ торговъ отъ казеннаго управленія и употребленный на дорожныя сооруженія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по ст. III В.	—	1200	—	—	640	08	—	1500	—	—	—	—
Итого по ст. III.	—	13300	—	—	4883	89	—	8900	—	—	—	—
Итого по статьямъ I, II и III.	—	39299	—	—	28626	43	—	26644	—	—	—	—
Статья IV-я.												
Администрація.												
1) Завѣдующему отъ земства.	—	987	—	—	936	38	—	648	—	—	—	—
2) Инженерамъ и техникамъ.	—	4437	—	—	4628	—	—	2916	—	—	—	—
3) Дорожнымъ мастерамъ.	5	3000	—	—	2601	—	3	2400	—	—	—	—
4) Дѣлопроизводителю, помощникамъ дѣлопроизводи- теля, канцелярскимъ чинамъ, чертежнику и кан- целярскіе расходы	—	2761	—	—	3050	77	—	1814	—	—	—	—
5) Расходы по приѣмкѣ шоссе въ 1896 году.	—	6900	—	—	2135	—	—	5300	—	—	—	—
6) Разѣзды	—	2465	—	—	1977	59	—	1620	—	—	—	—
7) Наемъ помѣщенія	—	493	—	—	493	—	—	324	—	—	—	—
Итого по ст. IV.	—	21043	—	—	15821	74	—	15022	—	—	—	—
Итого по статьямъ I, II, III и IV.	—	60342	—	—	44448	17	—	41666	—	—	—	—

СТОКЪ ковское шоссе верстъ.			III УЧАСТОКЪ Воронежское шоссе 70,920 верстъ.						Всего по шоссе 390,983 верстъ.						Средніе выводы расходовъ на одну версту по всему шоссе.		
Израсходовано.			Смѣтное наз- наченіе.			Израсходовано.			Смѣтное наз- наченіе.			Израсходовано.			Средніе выводы расходовъ на одну версту по всему шоссе.		
Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.		Количе- ство.	Сумма.	
	Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.		Руб.	К.
Меж. 133 пог. 3 в. 9	104	99	—	100	—	Меж. 615 пог. 1 в. 72 с. 329	459	36	—	500	—	—	836	98	—	2	17
—	12	31	—	500	—	—	1167	92	—	1000	—	—	1468	44	—	3	75
—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	07
—	817	—	—	1500	—	—	2228	16	—	4200	—	—	3685	24	—	9	43
—	5947	76	—	13893	—	—	7577	23	—	36093	—	—	18408	88	—	47	09
—	33001	54	—	19975	—	—	12998	89	—	85918	—	—	74626	86	—	190	88
—	614	24	—	365	—	—	343	77	—	2000	—	—	1894	39	—	4	85
—	3225	—	—	1647	—	—	1647	—	—	9000	—	—	9500	—	—	24	30
—	1695	—	2	1200	—	—	920	—	10	6600	—	—	5216	—	—	13	34
—	1980	04	—	1025	—	—	1163	15	—	5600	—	—	6193	96	—	15	84
—	1393	61	—	3232	—	—	785	50	—	15432	—	—	4314	11	—	11	03
—	1426	39	—	915	—	—	896	61	—	5000	—	—	4300	59	—	11	—
—	324	—	—	183	—	—	183	—	—	1000	—	—	1000	—	—	2	56
—	10658	28	—	8567	—	—	5939	03	—	44632	—	—	32419	05	—	82	91
—	43659	82	—	28542	—	—	18937	92	—	130550	—	—	107045	91	—	273	79



1378-5

Смѣтное предположеніе на 1897 годъ не выполнѣ согласуется съ расходомъ этого года, главнымъ образомъ, потому, что губернская управа, при полномъ почти незнакомствѣ съ потребностями шоссе, принятаго съ 1-го января 1897 г. въ завѣдываніе земствомъ, не могла составить достаточно подробныхъ и точныхъ смѣтъ, а было составлено лишь приблизительное росписаніе суммъ.

Въ частности соотвѣтственно статьямъ смѣты остатки и передержки объясняются слѣдующимъ образомъ:

По I участку.

По статьѣ I. Количество щебня назначено на сумму 13500 р., а израсходовано 14312 р. 16 к., *болѣе* противъ предположенія на 812 р. 16 к., хвороста для застилки слабыхъ мѣстъ назначено на сумму 200 р., расхода же не было произведено за отсутствіемъ пучинистыхъ мѣстъ; на заполняющій матеріалъ назначено 750 р., израсходовано же 271 р. 74 к., т. е. *менѣе* противъ предположенія на 478 р. 26 к.

Всего по ст. I израсходовано *болѣе* противъ предположенія на сумму 103 руб. 90 коп.

По статьѣ II. 1) *На сезонныя работы*: (зимнія, весеннія, лѣтнія и осеннія) назначено 6375 руб., а израсходовано 4419 руб. 96 коп., *менѣе* противъ предположенія на 1955 руб. 04 коп. по дѣйствительной потребности.

2) *На розсыпь щебня* и укатку его назначено 2780 р., а израсходовано 2166 руб. 29 коп., *менѣе* противъ предположенія на 613 руб. 71 к. по дѣйствительной потребности.

3) *На инструменты* назначено 1494 р., а израсходовано 1106 руб. 66 коп., т. е. *менѣе* противъ предположенія на 387 руб. 34 коп.

4) *На дренажъ* слабыхъ мѣстъ назначено 500 руб., расхода же не было произведено за отсутствіемъ весною 1897 г. пучинистыхъ мѣстъ. На углубленіе канавъ израсходовано *менѣе* противъ предположенія на 54 р. 31 к. На исправленіе весеннихъ поврежденій по смѣтѣ не было назначено, израсходовано же по дѣйствительной потребности 1150 руб. 04 к. Расходъ этотъ въ предположеніи не предвидѣлся, такъ какъ неизвѣстно было, будутъ ли вышесказанные поврежденія и въ какомъ размѣрѣ.

Всего по статьѣ II израсходовано *менѣе* противъ смѣтнаго предположенія на сумму 2360 руб. 36 коп.

По статьѣ III. А) *На перестройку мостовъ* было ассигновано 600 р., а израсходовано 1253 руб. 86 коп., *болѣе* противъ предположенія на 653 руб. 86 коп.; на капитальный ремонтъ мостовъ было назначено

6000 руб., а израсходовано 2162 руб. 28 коп., *меньше* противъ предположенія на 3837 руб. 72 коп.; на мелкій ремонтъ мостовъ ассигновано 1500 руб., а израсходовано 278 руб. 25 коп., *меньше* противъ предположенія на 1221 руб. 75 коп.; на содержаніе переправы израсходовано 287 руб. 39 коп., ассигнованія же на нее не было, такъ какъ содержаніе оной не предвидѣлось.

Б) На постройку зданій было назначено 3000 руб.; сумма эта не израсходована, такъ какъ постройка зданій отложена была на 1898 годъ. На ремонтъ и содержаніе зданій было назначено 1000 руб., а израсходовано 262 руб. 03 коп., *меньше* на 737 руб. 97 коп., по дѣйствительной потребности.

В) Второстепенныя дорожныя сооруженія.

На постройку переездныхъ мостиковъ назначено 200 р., а израсходовано 79 руб. 24 коп. На предохранительныя тумбы и посадки назначено 500 руб., расхода же не было произведено въ виду отсутствія въ нихъ надобности.

На межевыя, пограничныя, верстовыя и сотенныя знаки израсходовано болѣе предположенія на 60 руб. 84 коп.

Всего по ст. III имѣется остатокъ 8416 руб. 11 коп.

По статьѣ IV. Администрація. На администрацію ассигновано 21043 р., а израсходовано 15821 руб. 74 коп., *меньше* противъ предположенія на 5221 руб. 26 коп. Означенный остатокъ произошолъ влѣдствіе ассигнованія слишкомъ большой суммы на пріемку шоссе и непредвидѣнные расходы, а именно: $6900 \text{ р.} - 2135 = 4765 \text{ руб.}$ Всего же остатка по ст. IV по I уч. имѣется 5221 р. 26 к. А всего остатка отъ ремонтнаго содержанія I уч. Витебско-Орловскаго шоссе въ 1897 г. по статьямъ: I, II, III и IV имѣется 15893 р. 83 к.

По II участку.

По статьѣ I. Ремонтныя матеріалы

1) *а и б. Камень для мостовой.* Предположеніе для перемощенія мостовой на IV перегонѣ, на 13 верстѣ за Московскими воротами, въ росписаніе суммъ на 1897 годъ не вошло, такъ какъ не имѣлось и въ ввиду производить этихъ работъ, но по вскрытіи снѣга мостовая оказалась въ очень плохомъ состояніи и губернская управа постановила произвести перемощеніе этой мостовой всего на протяженіи 0,877 верстѣ. Произведено было перемощеніе средней части шириною въ 4^е булыжнымъ камнемъ,

перемощеніе же лѣвой обочины ширин. въ 2^е и правой шириною въ 0,50 саж. известковымъ камнемъ.

Всего перемощено было 2642,50 кв. саж. мостовой, для чего потребовалось добавить 21,85 куб. саж. булыжнаго и 30 куб. саж. известковаго камня.

2) а) *Щебня* заготовлено на сумму 11063 руб. 52 коп., т. е. на 1063 р. 52 к., *болѣе* противъ предположенія.

б) *Камня* для щебня приобрѣтено $18\frac{2}{3}$ куб. саж. Камень этотъ былъ излишне выставленъ поставщиками и управа нашла возможнымъ приобрѣсти его у поставщиковъ.

3) *Заполняющій матеріалъ*. По смѣтѣ на заполняющій матеріалъ было назначено 375 руб., а израсходовано 134 руб. 82 коп., вслѣдствіе того, что высѣвокъ отъ разбивки щебня оказалось достаточно для заполняющаго матеріала, песку потребовалось приобрѣсти $8\frac{7}{16}$ куба, на сумму 134 руб. 82 коп., т. е. на 240 руб. 18 коп. *менѣе* противъ предположенія.

5) *Песокъ*. По смѣтѣ ничего не было назначено на приобрѣтеніе песку для мостовыхъ, такъ какъ не имѣлось въ виду такового перемощенія. Потребовалось же $152\frac{1}{2}$ куба песку на сумму 533 руб. 75 коп.

Всего же перерасходъ по ст. I въ 1897 г. составляетъ 4545 р. 9 к.

По Статьѣ II. А) Сезонныя работы.

1) а) *На снѣговья зашиты* было назначено 360 руб., а израсходовано только 147 руб. 20 коп., сообразно съ дѣйствительною необходимостью, на 212 руб. 80 коп. *менѣе*.

б) *На зимнія работы* было назначено 400 р., а израсходовано 1008 р. 29 к., т. е. на 608 р. 29 к. *болѣе* сообразно съ дѣйствительною потребностью.

2) *На весеннія работы* б) было назначено 1050 р., а израсходовано только 266 руб. 37 коп., т. е. на 783 руб. 63 коп. *менѣе* вслѣдствіе благоприятной весны, не вызвавшей много работъ.

3) *На лѣтнія работы* ассигновано 1300 руб., а израсходовано 2146 р. 84 коп., т. е. на 846 руб. 84 коп. *болѣе* сообразно съ дѣйствительною потребностью.

5) а и б) *На розсыпъ щебня* было ассигновано 900 руб., а израсходовано 1315 руб. 32 коп., а также на укатку ассигновано 260 руб., а израсходовано 443 руб. 63 коп., вслѣдствіе того, что кромѣ назначенной къ поставкѣ щебня былъ разсыпанъ и укатанъ еще щебень, полученный отъ казеннаго управленія.

6) *На инструменты* было назначено 1127 р., а израсходовано 1425 р. 23 коп., влѣдствіе того, что для исправленія весеннихъ поврежденій пришлось пріобрѣсти довольно значительное количество инструментовъ для граборовъ.

Б. Работы капитальнаго ремонта.

1) *На дренажъ* слабыхъ мѣстъ по смѣтѣ назначено 300 руб., а ничего не израсходовано влѣдствіе не обнаружившейся въ томъ необходимости.

2) *На углубленіе канавъ* было назначено 300 руб., но этихъ работъ не было произведено, такъ какъ землекопы, нанятые для производства этихъ работъ, были заняты исправленіемъ весеннихъ поврежденій.

3) *На исправленіе весеннихъ поврежденій* израсходовано 2517 р. 26 к., по смѣтѣ же ничего не было назначено, такъ какъ неизвѣстно было, будутъ ли таковыя.

Всего же по статьѣ II имѣется въ 1897 году перерасходъ 4764 руб. 69 коп.

По статьѣ III. А) *На перестройку мостовъ и трубъ* было ассигновано 1500 руб., а израсходовано 1054 руб. 91 коп., на капитальный ремонтъ мостовъ и трубъ было ассигновано 2500 руб., а израсходовано 3234 руб. 95 коп. и, наконецъ, на мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ было ассигновано, 1000 руб., а израсходовано 613 руб. 99 коп. согласно дѣйствительной необходимости.

Б. 1) *На постройку зданій* было назначено 2000 руб., но не израсходовано, такъ какъ постройка была отложена влѣдствіе предполагаемаго перерасхода по другимъ статьямъ смѣты.

2 и 3) *На содержаніе и ремонтъ зданій* было израсходовано сообразно съ дѣйствительною необходимостью.

В. 1) *Постройка лотка* на IV перегонѣ 13 версты, обошедшаяся въ 188 руб. 91 коп., была вызвана перемощеніемъ мостовой.

2) *Посадка ракушекъ* была исполнена на сумму только 168 руб. 49 коп., вмѣсто 800 руб. назначенныхъ по смѣтѣ.

3 и 4) *Межевые, сотенные и пограничные знаки, верстовые столбы и предохранительныя тумбы* не были поставлены полностью; по смѣтѣ ассигновано было 1200 руб., израсходовано 315 руб. 79 коп., остатокъ 884 р. 21 коп. Всего по статьѣ III ассигновано 8900 руб., израсходовано 5947 р. 76 коп., т. е. меньше противъ смѣты на 2952 руб. 24 коп.

По статьѣ IV. *Администрація.*

2) По этому пункту израсходовано 3225 руб. вмѣсто 2916 руб., назначенныхъ по смѣтѣ влѣдствіе приглашенія еще одного техника.

3) *На дорожныхъ мастеровъ* было назначено по смѣтѣ 2400 руб., а израсходовано 1695 руб. сообразно дѣйствительной необходимости.

5) *На приемку шоссе* было ассигновано 5300 руб., а израсходовано только 1393 руб. 61 коп., такимъ образомъ получился остатокъ въ 3906 р. 39 коп., вслѣдствіе того, что расходы по приемкѣ оказались *меньше* предположенія.

Всего же по статьѣ IV ассигновано 15022 руб., израсходовано 10658 руб. 28 коп., *меньше* противъ смѣты на 4363 руб. 72 коп.

А всего на содержаніе II участка шоссе по смѣтѣ было назначено 41666 руб., а израсходовано 43659 руб. 82 коп., такъ что произведена передержка въ 1993 руб. 82 коп.

По III участку.

По статьѣ I. Количество *щебня и песку* заготовлено *больше* противъ предположенія на сумму 369 р. 27 к. по дѣйствительной потребности.

По статьѣ II. 1) *На сезонныя работы* (зимнія, весеннія, лѣтнія и осеннія) израсходовано *меньше* противъ предположенія на 1126 р. 22 к. по дѣйствительной потребности.

2) *На розсыпь щебня* и укатку его израсходовано *больше* противъ предположенія на 393 р. 87 к., вслѣдствіе необходимости разсыпать его въ большомъ количествѣ, а равно закатать розсыпи 1896 г., неудовлетворительно произведенныя при казенномъ управленіи.

3) *На инструменты* израсходовано на 181 руб. 16 к. *меньше* противъ предположенія.

Всего по ст. II израсходовано *меньше* противъ смѣтнаго предположенія на 1029 руб. 61 коп.

По статьѣ III. 1) *Мосты.* Въ остаткѣ имѣются 10000 р., назначенные на могущую встрѣтиться необходимость въ перестройкѣ Клементьевской трубы, признанной при приемкѣ шоссе опасною, но поддержанною мелкимъ ремонтомъ и оставленною безъ перестройки. Въ виду этого на мелкій ремонтъ этой трубы, а равно оказавшихся въ весьма неудовлетворительномъ состояніи всѣхъ прочихъ трубъ, израсходовано 1199 р. 66 к., *больше* противъ смѣтнаго предположенія на 506 р. 66 к.

2) *Зданія.* Вслѣдствіе оказавшейся необходимости построить казарму для помѣщенія дорожнаго мастера и ремонтчиковъ, таковая была построена, на что израсходовано 3878 р. 71 к., хотя въ росписаніе суммъ не была внесена.

За симъ на ремонтъ и содержаніе существующаго заставнаго дома, обращенный въ квартиру дорожнаго мастера и ремонтчиковъ, израсходовано на 70 р. 70 к. *болѣе* противъ предположенія.


3) *Второстепенное дорожное сооруженіе.* а) Признано необходимымъ установить верстовые столбы каменные, вмѣсто предположенныхъ деревянныхъ, на что израсходовано на 667 р. 92 к. *болѣе* противъ предположенія. б) Поставлены межевые знаки для огражденія полосы отчужденія 20^с отъ захватовъ, вмѣсто примѣрной суммы 100 р. израсходовано на 359 р. 36 к. *болѣе* противъ предположенія.

Всего по ст. III имѣется *остатокъ* 6315 р. 77 к.

По **статьѣ IV. Администрація.** Имѣется тоже остатокъ противъ смѣты, произшедшій, главнымъ образомъ, влѣдствіе ассигнованія оказавшейся излишнею суммы на приѣмку шоссе и непредвидѣнные расходы 3232 р., между тѣмъ израсходовано лишь 785 р. 50 к., такимъ образомъ *остатка* по ст. IV отъ смѣты 1897 г. имѣется 2627 р. 97 к.

Всего же *остатка* по ремонтному содержанію III уч. (Воронежскаго шоссе) въ 1897 году имѣется 9604 р. 08 к.

А по содержанію всѣхъ шоссе Орловскаго земства — *остатокъ* правительственной субсидіи отъ 1897 г. составляетъ 23504 р. 09 к.

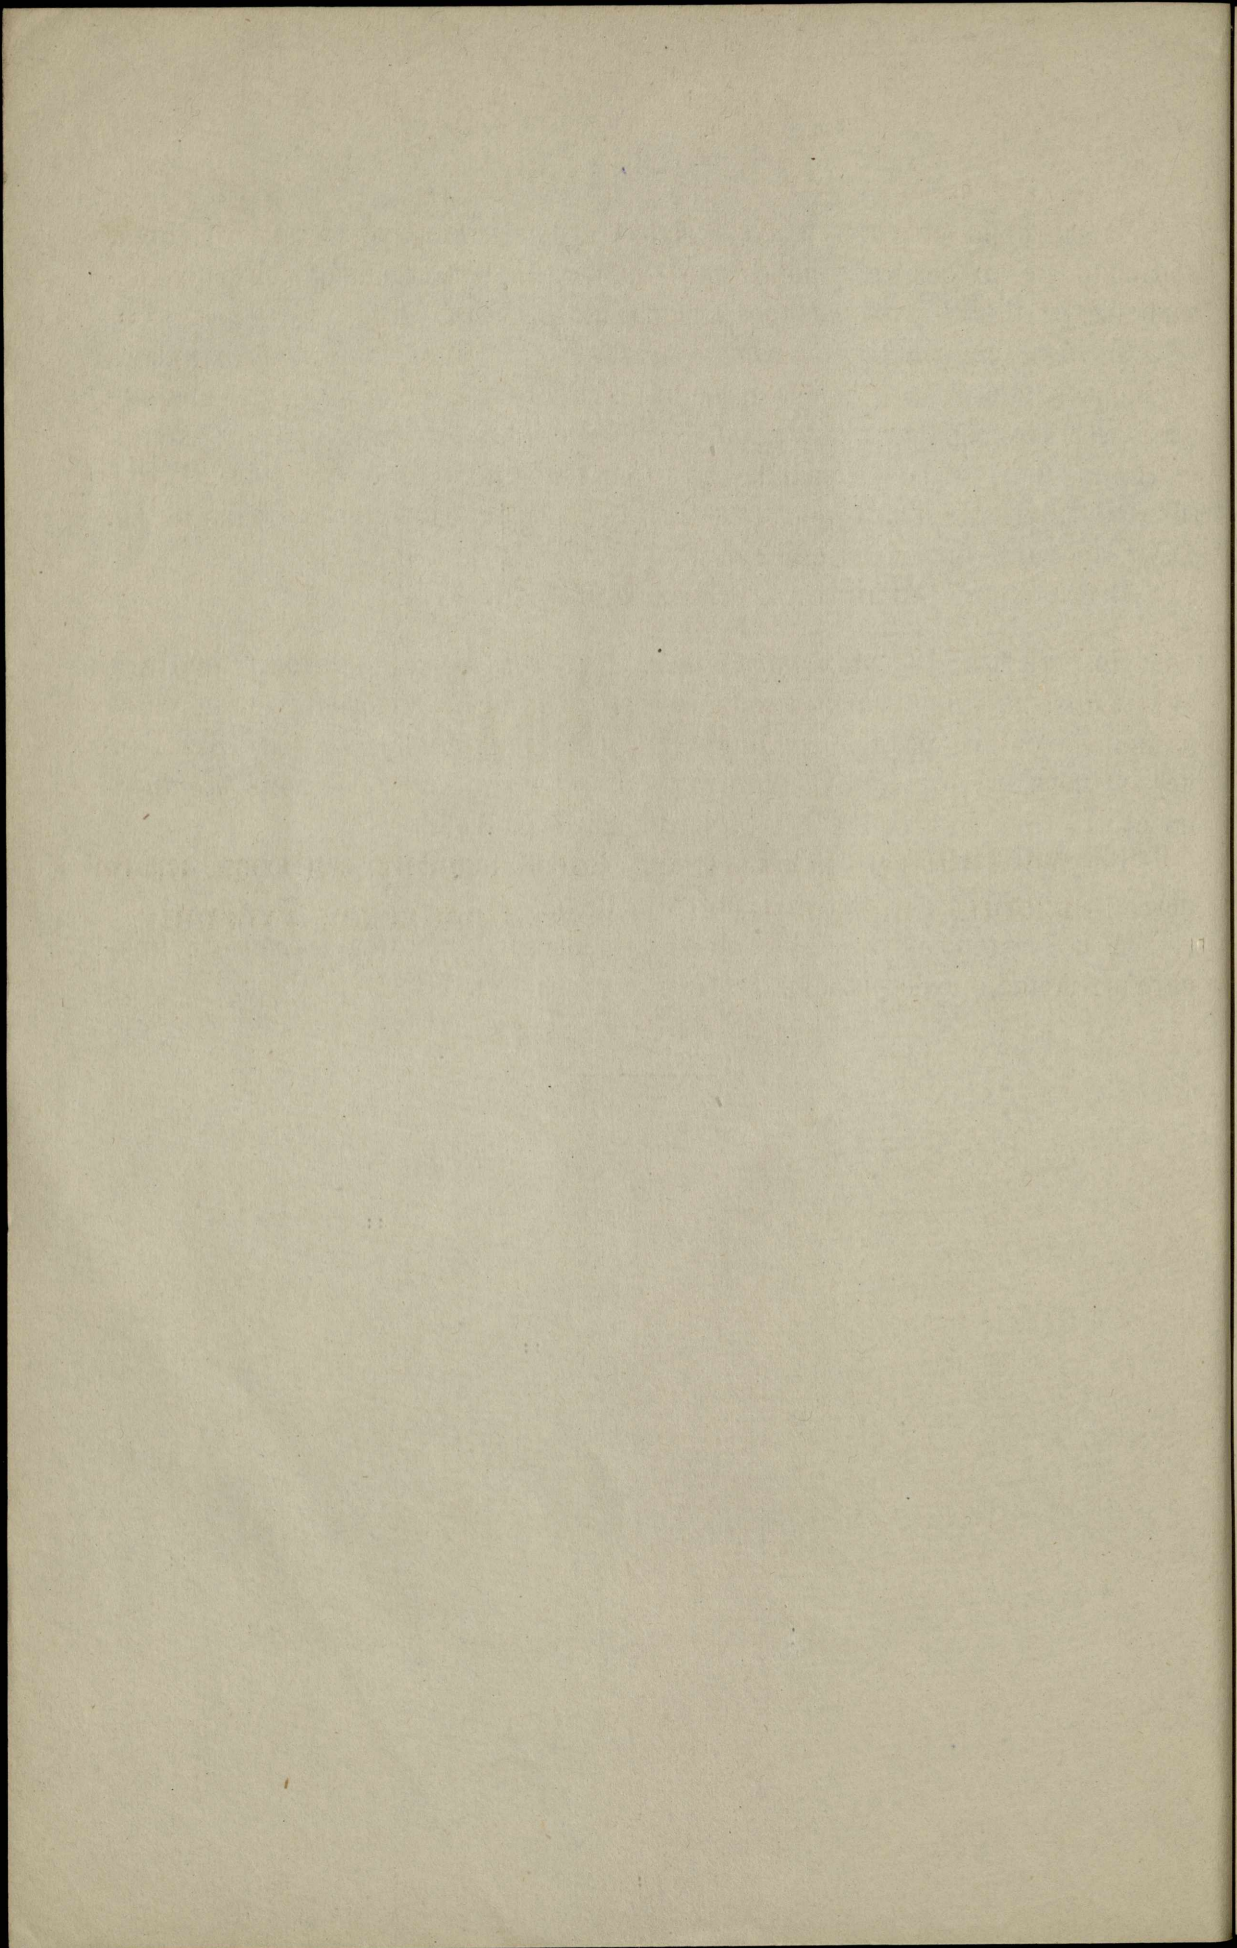

ТАБЛИЦА

съ показаніемъ средняго на одну версту расхода по со-
держанію шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи

за 1897 годъ.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

1950-1951

1952-1953

1954-1955

1956-1957

1958-1959

1960-1961

1962-1963

1964-1965

1966-1967

1968-1969

1970-1971

1972-1973

1974-1975

1976-1977

1978-1979

1980-1981


ОБЩІЙ СВОДЪ

оборота каменнаго матеріала на шоссе Орловской губерніи

за 1897 годъ.

Наименованіе шоссе.	Количе- ство верстъ.	Толщина щебеноч- наго слоя въ дюй- махъ.				Разсыпано щебня съ 1896 г. по 1 января 1897 г.	Состояло щебня къ 1-му января 1897 г. въ кубич. саженьяхъ.			Состояло камня неби- таго на лицо къ 1 янва- ря 1897 года.	Поступило въ продол- женіи 1897 года щебня кубическ. сажен.
		1896 года.			Нормальная.		На ремонтъ и утолщеніе.	Запаснаго.	ВСЕГО.		
I. Витебско-Орловское шоссе.											
I участокъ.											
Отъ границы Смоленской губ. до гор. Орла	193,395	3,7	—	—	4,5	—	590 ³ / ₈	—	590 ³ / ₈	17 ² / ₈	309 ² / ₈
2. Подольско-Харьковское шоссе.											
II участокъ.											
Отъ границы Тульской губ. до границы Курской губ.	126,668	5,1	—	—	4,5	—	194 ⁶ / ₈	—	194 ⁶ / ₈	37 ⁷ / ₈	394 ⁵ / ₈
3. Воронежское шоссе.											
III участокъ.											
Отъ границы Тульской губ. до границы Воронежской губ. . . .	70,92	5,6	—	—	4,5	—	1 ⁶ / ₈	12 ⁴ / ₈	14 ² / ₈	—	125 ² / ₈
По всему шоссе . . .	390,983	—	—	—	—	—	786⁷/₈	12⁴/₈	799³/₈	21¹/₈	829¹/₈

Употреблено въ 1897 г. въ кубическ. саженяхъ.			Осталось къ 1-му января 1898 г. въ кубическ.саженяхъ			Предполагается имѣть въ 1898 году, въ кубическихъ саженяхъ.					Предполагает- ся къ заготов- кѣ въ 1898 г., въ кубич. сажен.		Осталось камня неби- таго къ 1-му января 1898 года	Количество верстъ.	Примѣчаніе.
На ремонтъ.	На утолщеніе.	ВСЕГО.	На ремонтъ и утолщеніе.	Запаснаго.	ВСЕГО.	На ремонтъ.	На утолщеніе.	Въ запасъ.	ВСЕГО.	Мостоваго камня.	На ремонтъ и утолщеніе.	Мостоваго камня.			
106 ⁶ / ₈	481 ⁷ / ₈	588 ⁵ / ₈	268	43	311	240 ³ / ₈	286 ⁶ / ₈	54 ⁷ / ₈	591	—	280	—			
115 ⁵ / ₈	312 ⁶ / ₈	428 ³ / ₈	104 ⁶ / ₈	56 ² / ₈	161	126 ² / ₈	276 ³ / ₈	83 ⁶ / ₈	456 ³ / ₈	2	325 ³ / ₈	2	для шоссе 20 ⁷ / ₈ для мостов. 7 ⁷ / ₈	126,668	
87 ³ / ₈	40	127 ³ / ₈	—	12 ¹ / ₈	12 ¹ / ₈	153 ⁵ / ₈	48	17 ⁴ / ₈	219 ¹ / ₈	155 ³ / ₈	207	150	5 ³ / ₈	70,92	
309 ⁶ / ₈	834 ⁵ / ₈	1144 ³ / ₈	372 ⁶ / ₈	111 ³ / ₈	484 ¹ / ₈	529 ² / ₈	611 ¹ / ₈	156 ¹ / ₈	1296 ⁴ / ₈	157 ³ / ₈	812 ³ / ₈	152	для шоссе 33 ² / ₈ для мостов 7 ⁷ / ₈ 41 ¹ / ₈	390,983	

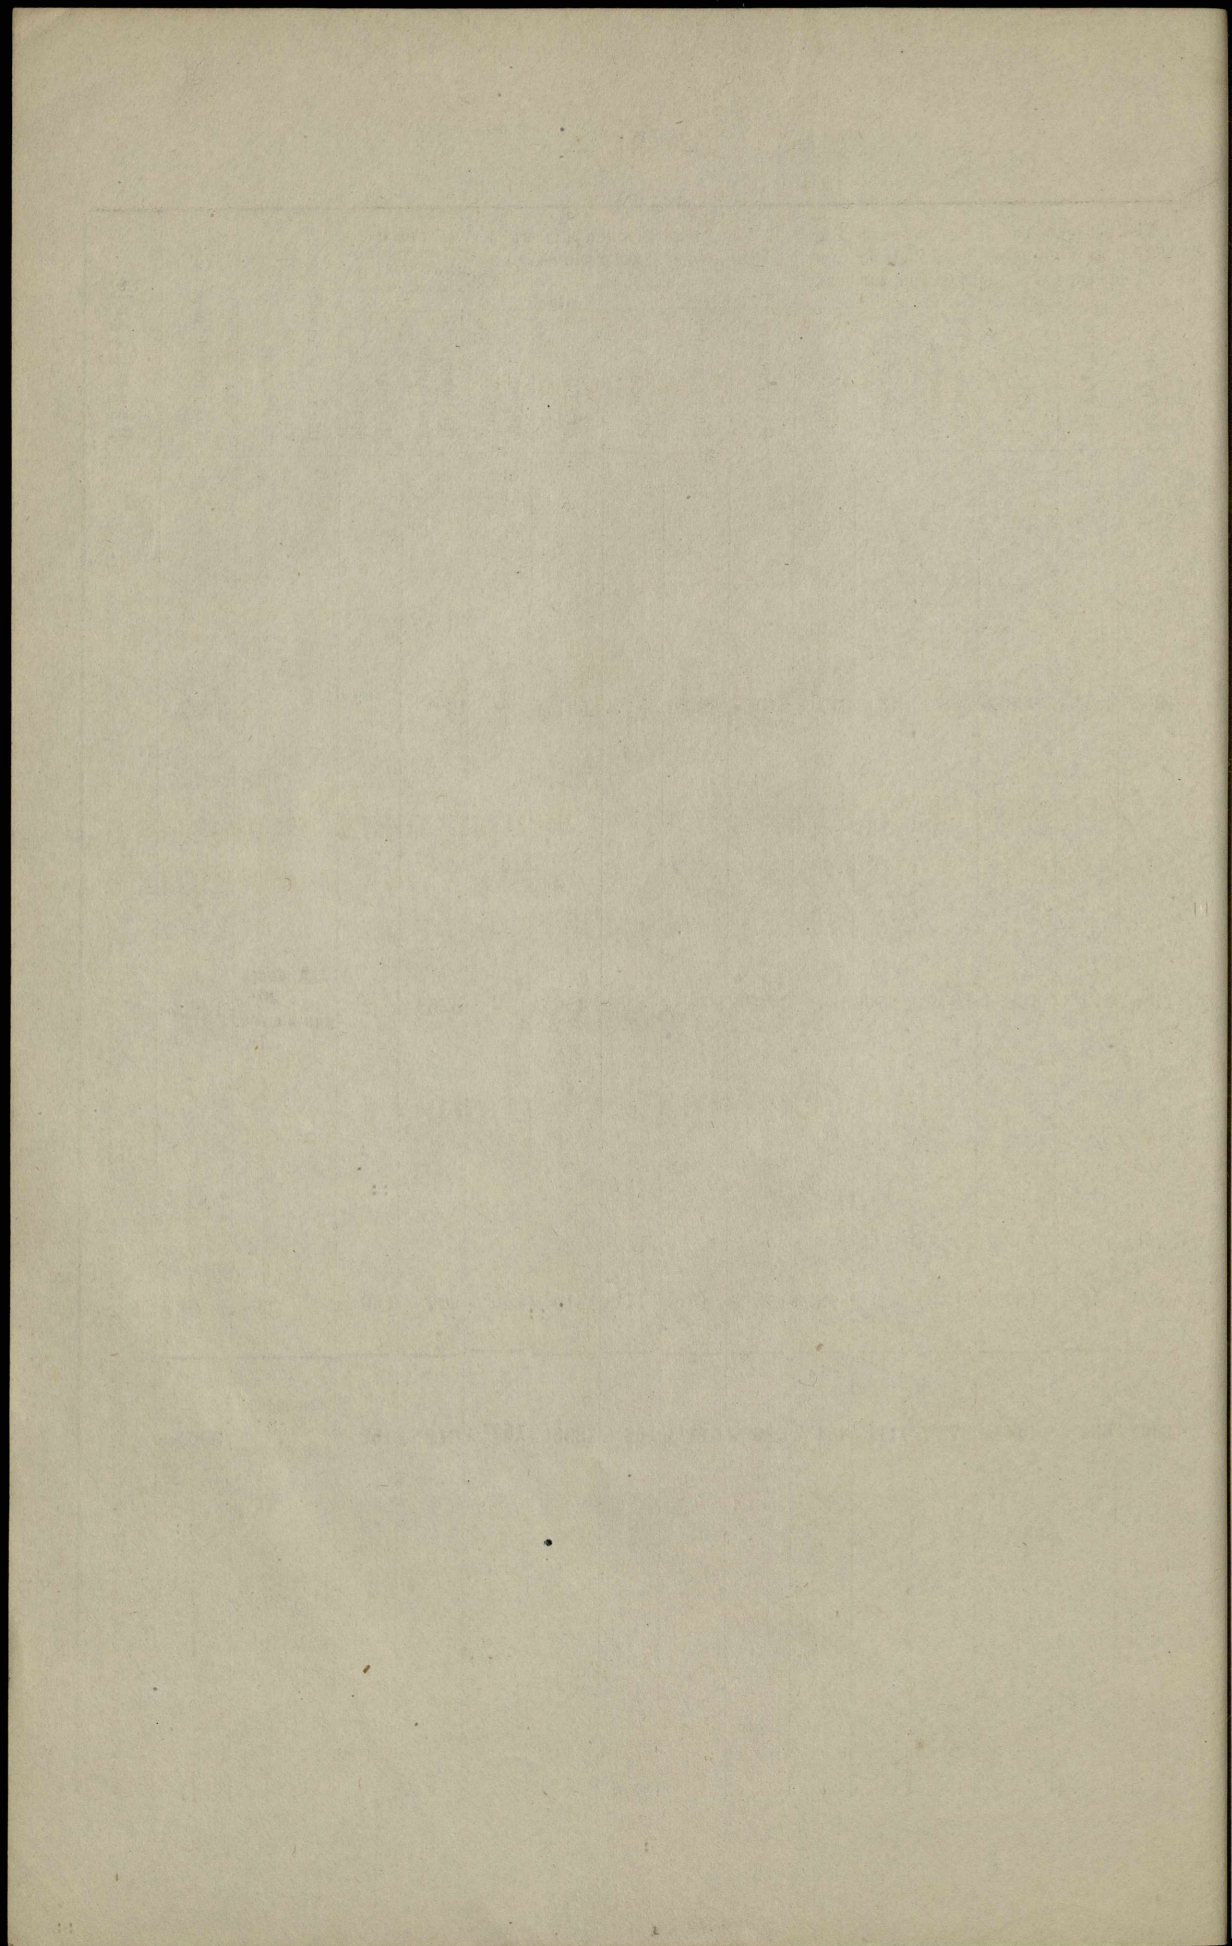

ВѢДОМОСТЬ

о перестройкѣ и капитальномъ исправленіи мостовыхъ
сооруженій, произведенныхъ въ 1897 г. на шоссейныхъ
дорогахъ Орловской губерніи.

І участка

Витебско-Орловское шоссе.

№ № верстг.	№ № сооруже́ній.	Наименованіе перегоновъ и сооруже́ній, находящихся на шоссе.	Передано земству Орловской губерніи.			
			Количество.	Годъ устройства.	Въ саженьяхъ.	
					Длина.	Ширина.
Мостовыя сооруже́нія.						
II ПЕРЕГОНЪ.						
Жуковая-Угость.						
10	53	Ледорѣзъ у деревяннаго моста подкосной системы	1	1890	25 ³ / ₇	4
III ПЕРЕГОНЪ.						
Угость-Шахматы.						
10	71	Мостъ деревянный балочной системы съ шоссированнымъ накатникомъ	1	1891	6	4
11	72	То же	1	1891	7	4
VII ПЕРЕГОНЪ.						
Алымовка-Карачевъ,						
8	124	Мостъ деревянный балочной системы съ досчатымъ настиломъ	1	1889	26	4
13	127	Мостъ деревянный балочный съ досчатымъ настиломъ.	1	1889	20	4 выс. 3,5
19	129	То же	1	1890	12	4
20	130	То же	1	1889	25	4

Стоимость работъ, произведенныхъ земствомъ въ 1897 году.							Описаніе произведенныхъ работъ.
Перестройка и устройство.					Исправленіе.		
Количество.	Въ саженьяхъ.		На сумму.		На сумму.		
	Длина.	Ширина.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	1	60	Разобранъ ледорѣзъ, предполагаемый къ постройкѣ въ 1898 г.
—	—	—	—	—	78	60	Перемѣнена $\frac{1}{2}$ наката 12 кв. саж.
—	—	—	—	—	87	45	То же 14 кв. саж.
—	—	—	—	—	494	27	Перемѣнено настила съ добавленіемъ новыхъ досокъ и пластинъ кв. саж. 104 и перемѣнены перила.
—	—	—	—	—	53	60	Разобранъ настиль, снята часть прогоновъ и насадокъ, забита новая свая и настанъ настиль.
—	—	—	—	—	31	40	Исправлена часть настила.
—	—	—	—	—	15	15	Исправлена часть настила.


№ верст.	№ сооружений.	Наименованіе перегоновъ и сооружений, находящихся на шоссе.	Передано земству Орловской губерніи.			
			Количество.	Годъ устройства.	Въ саженьяхъ.	
					Длина.	Ширина.
		VIII ПЕРЕГОНЪ. <i>Нарачевъ—Норово.</i>				
2	133	Мостъ деревянный балочный съ досчатымъ настиломъ	1	1889	18	4
		IX ПЕРЕГОНЪ. <i>Норово—Горни</i>				
16	161	Мостъ деревянный балочный съ шоссирован-нымъ накатникомъ	1	1888	5	4
16	162	То же	1	1888	3	4
15	160	То же	1	1889	6	4
		X ПЕРЕГОНЪ. <i>Горни—Ледна.</i>				
12	169	Мостъ деревянный балочный съ шоссирован-нымъ накатникомъ	1	1889	3	4
		XI ПЕРЕГОНЪ. <i>Ледна—Орель.</i>				
6	184	Мостъ деревянный балочной системы съ до-счатымъ настиломъ	1	1888	14	4
10	188	Мостъ деревянный подкосной системы съ до-счатымъ настиломъ	1	1891	30	4

Стоимость работъ, произведенныхъ земствомъ въ 1897 годъ.							Описаніе произведенныхъ работъ.
Перестройка и устройство.					Исправленіе		
Количество.	Въ сажаняхъ.		На сумму.		На сумму.		
	Длина.	Ширина.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	71	04	Разобранъ настиль и вновь настланъ съ добавленіемъ новыхъ досокъ 11-ть кв. саж.
1	5	2 ² / ₃	304	38	—	—	Перестроенъ въ мостъ длиною 5 саж. и шириною 2 ² / ₃ саж. по типу, утвержденному правительственною инспекціею.
1	3	2 ² / ₃	212	27	—	—	Т о ж е.
—	—	—	375	79	—	—	Заготовленъ матеріалъ для постройки по типу существующему.
—	—	—	126	88	—	—	Заготовленъ матеріалъ для перестройки въ мостъ длиною 3 саж. и шириною 2 ² / ₃ саж. по типу, утвержденному правительственною инспекціею.
—	—	—	—	—	167	25	Заготовлены доски для перемѣны части настила.
—	—	—	—	—	983	53	Перемѣненъ настиль кв. саж. 120 и исправлены перила.

№ верст.	№ сооружений.	Наименованіе перегоновъ и сооруженій, находящихся на шоссе.	Передаю земству Орловской губерніи.			
			Количество.	Годъ устройства.	Въ саженьяхъ.	
					Длина.	Ширина.
12	190	Мостъ деревянный балочной системы съ досчатымъ настиломъ	1	1891	10	4
16	193	Мостъ деревянный балочный съ шоссированнымъ накатникомъ	1	1891	5	4
Итого			—	—	—	—

Стоимость работъ, произведенныхъ земствомъ въ 1897 году.						
Перестройка и устройство.					Исправленіе.	
Количество.	Въ саженьяхъ.		На сумму.		На сумму.	
	Длина.	Ширина.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
—	—	—	—	—	178	39
1	3	2 ² / ₃	234	54	—	—
			1253	86	216	228
			3416 р. 14 к.			

Исправленъ настилъ съ добавленіемъ новыхъ досокъ квад. саж. 40.
Перестроенъ въ мостъ длиною 3 саж. и шириною 2 ² / ₃ саж. по типу, утвержденному правительственною инспекціею, съ засыпкой части отверстія.

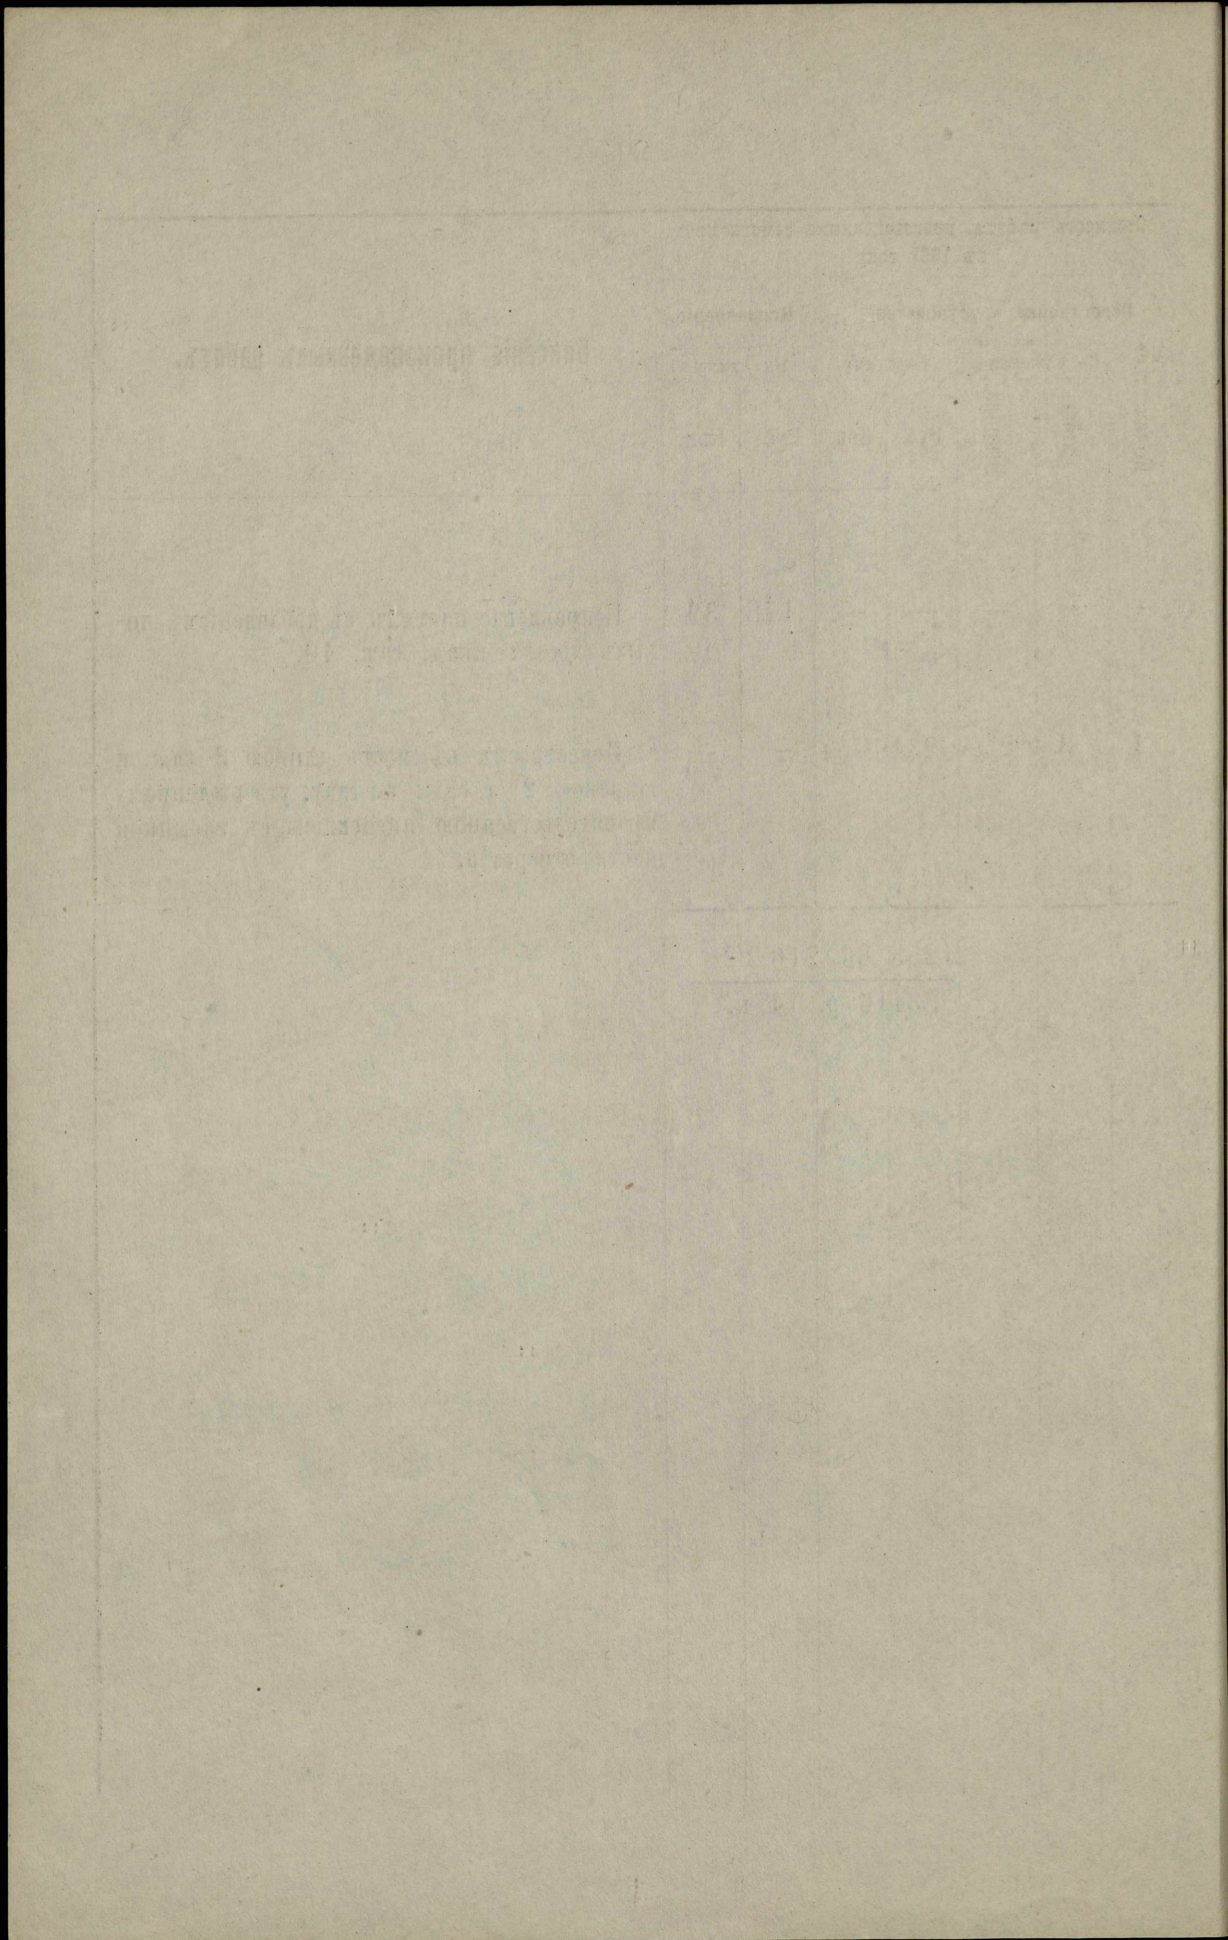

ВѢДОМОСТЬ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооружений,
произведенныхъ въ 1897 году, на шоссейныхъ дорогахъ
Орловской губерніи.

II-й участокъ

Подольско-Харьковское шоссе.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе перегоновъ и сооруженій, находящихся на шоссе.	Передано земству Орловской губерніи.			
			Количество.	Годъ постройки.	Въ саженьяхъ.	
					Длина.	Ширина.
Мостовыя сооруженія.						
I ПЕРЕГОНЪ.						
Отъ границы Тульской губ. до г. Мценска.						
2	1/214	Деревянный мостъ съ открытымъ пластин- нымъ поломъ	1	1884	7	3 1/2
II ПЕРЕГОНЪ.						
Мценскъ—Ильново.						
2 8	7/223 11/227	Трубы кирпичная и цилиндрическая . . .	—	—	—	—
III ПЕРЕГОНЪ.						
Ильново—Ивановская.						
4	18/234	Деревянный мостъ арочной системы. . . .	1	1885	11 1/2	4 1/2
12	25/241	Чугунная и цилиндрическая труба	1	1847	22 1/2	1 отвер- стие.
16	29/245	Деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ. .	1	1895 96	27	4 2/3
IV ПЕРЕГОНЪ.						
Ивановская—Орелъ.						
3	31/247	Деревянный шоссированный мостъ	1	1896	3	4

Стоимость работъ, произведенныхъ земствомъ въ 1897 году.						Описаніе произведенныхъ работъ.		
перестройна и устройство.				Исправленіе.				
Количество.	Въ саженьяхъ.		На сумму.		На сумму.			
	Длина.	Ширина.	Руб.	Коп.	Руб.			Коп.
—	—	—	—	—	426	40	Смѣнены насадки, прогоны, настиль и перила, остались только старыя сваи забитыя въ 1895 году.	
—	—	—	—	—	2	20	Мелкій ремонтъ.	
—	—	—	—	—	2	—	Ремонтирована часть настила досками, перевезенными съ Оптуховской заставы.	
—	—	—	—	—	25	25	Прочищена труба отъ ила, съ отвозкою за 10 ^с кубич. саж. 16,5.	
—	—	—	—	—	120	—	Караулъ и присмотръ за мостомъ.	
—	—	—	—	—	1	—	Вставлено въ прижимы 4 болта, сдѣланные изъ стараго желѣза.	

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе перегоновъ и сооружений, находящихся на шоссе.	Передано земству Орловской губерніи.			
			Количество.	Годъ постройки.	Въ саженьяхъ.	
					Длина.	Ширина.
V ПЕРЕГОНЪ.						
Орелъ—Салтыки.						
8	⁴³ / ₄	Деревянный шоссированный мостъ	1	1888	2 ¹ / ₂	5 ¹ / ₃
14	⁴⁷ / ₈	Деревянный мостъ съ открытымъ пластин- нымъ поломъ	1	1884	4	3 ¹ / ₃
16	—	Деревянный мостъ	—	1897	—	—
		Номерные знаки мостовыхъ сооружений. . .	—	—	—	—
VI ПЕРЕГОНЪ.						
Салтыки—Кромы.						
2	⁵³ / ₁₅	Деревянный мостъ съ открытымъ поломъ . .	1	1883	3 ¹ / ₂	4
3	⁵⁴ / ₁₆	Деревянный мостъ подкосной системы . . .	1	1881	20	4 ¹ / ₃
4	⁵⁶ / ₁₈	Деревянный открытый мостъ	1	1881	3 ¹ / ₂	4
5	⁵⁷ / ₁₉	Деревянный открытый мостъ	1	1884	5	3 ¹ / ₃

Стоимость работъ, произведенныхъ земствомъ въ 1897 году.						Описаніе произведенныхъ работъ.		
Перестройка и устройство.				Исправленіе.				
Количество.	Въ саженьяхъ.		На сумму.		На сумму.			
	Длина.	Ширина.	Руб.	Коп.	Руб.			Коп.
—	—	—	—	—	35	84	Ремонтированъ лотокъ у моста, съ употребленіемъ части новыхъ досокъ, съ осмолкою и проконопаткою и подсыпкою земли.	
1	3	3 ¹ / ₃	261	82	—	—	Перестроенъ въ мостъ длиною въ 3 саж. и поставлено 12 шт. тумбъ.	
1	4	3 ¹ / ₃	793	09	—	—	Построенъ новый мостъ длиною въ 4 саж. и къ нему деревянный лотокъ.	
—	—	—	—	—	14	14	Сдѣлано и поставлено по перегону номерныхъ знаковъ съ окраскою и надписью №№ сооружений.	
—	—	—	—	—	14	70	Поставлены новыя перила и прижимы.	
—	—	—	—	—	449	60	Смѣненъ настилъ.	
					33	70		Въ томъ же мостѣ произведенъ мелкій ремонтъ перилъ и колесоотбойныхъ брусьевъ.
—	—	—	—	—	14	70	Произведена переборка пластиннаго пола.	
—	—	—	—	—	18	70	Произведена переборка пластиннаго пола (настила) и ремонтъ перилъ и прижимовъ.	

№ № верст.	№ № сооружений.	Наименованіе перегоновъ и сооруженій, находящихся на шоссе.	Передаю земству Орловской губерніи.			
			Количество.	Годъ постройки.	Въ саженьяхъ.	
					Длина.	Ширина.
8	61/23	Деревянный мостъ подкосной системы	1	1887/88	40	4
10	62/24	Деревянный шоссированный мостъ	1	1887	3	3 1/8
11	63/25	Деревянный мостъ съ открытымъ пластин- нымъ поломъ	1	1884	5	3 1/3
12	64/26	Деревянный мостъ подкосной системы	1	1887	13 1/2	4
14	66/28	Деревянный открытый мостъ	1	1883	3 3/4	4
16	69/31	Тоже " "	1	1883	4 1/2	4
17	70/32	Тоже " "	1	1884	4	3 1/3
		Номерные знаки мостовыхъ сооруженій. . .	—	—	—	—
VII ПЕРЕГОНЪ.						
Кромы—Гастомля.						
4	75/40	Деревянный мостъ черезъ р. Крому. . . .	1	1896	22,86	4,79

Стоимость работъ, произведенныхъ земствомъ въ 1897 году.							Описаніе произведенныхъ работъ.
Перестройка и устройство.					Исправленіе.		
Количество.	Въ саженьяхъ.		На сумму.		На сумму.		
	Длина.	Ширина.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	802	86	Перестроены вновь три ледорѣза. Мелкій ремонтъ настила. Расходъ этотъ произведенъ на рабочихъ при весеннемъ ледоходѣ.
					1	40	
					1	20	
—	—	—	—	—	18	16	Поставлено у моста 12 шт. тумбъ и мелкій ремонтъ моста.
—	—	—	—	—	30	17	Перемѣнена часть пластиннаго пола и перила.
—	—	—	—	—	443	35	Смѣненъ досчатый настиль, перила и колесоотбойныя брусъя. Тамъ же поставлено 8 болтовъ.
					5	47	
—	—	—	—	—	18	85	Замѣнена негодная часть настила и прижимовъ.
—	—	—	—	—	18	73	Тоже.
—	—	—	—	—	156	15	Смѣненъ настиль и прижимы.
—	—	—	—	—	12	58	Сдѣлано и поставлено по перегону номерныхъ знаковъ съ надписью №№ сооруженій.
—	—	—	—	—	6	50	Поставлено въ полъ 3 новыхъ доски и 24 старыхъ отъ моста № ⁷⁹ /44, съ прибивкою гвоздями.

№ № верстъ.	№ № сооружеій.	Наименованіе перегоновъ и сооружеій, находящихся на шоссе.	Передано земству Орловской губерніи.			
			Количество.	Годъ постройки.	Въ саженьяхъ.	
					Длина.	Ширина.
16	79/44	Деревянный открытый мостъ	1	1887 88	28	4
		Номерные знаки мостовыхъ сооружеій . .	—	—	—	—
		VIII ПЕРЕГОНЪ.				
		<i>Гастомля—Котомна.</i>				
2	82/47	Деревянный открытый мостъ	1	1852	4 1/2	4
	90/55 92/57 94/59	Деревянные мосты	—	—	—	—
16	92/57	Деревянный подкосный мостъ	1	1852 77	10	4
		Кромѣ показанныхъ выше работъ, еще употребленъ въ дѣло на мелкій ремонтъ мостовыхъ сооружеій лѣсной матеріалъ, купленный съ торговъ отъ казеннаго управленія на сумму . . .	—	—	—	—
		ИТОГО	—	—	—	—

Стоимость работъ, произведенныхъ земствомъ въ 1897 году.						Описаніе произведенныхъ работъ.	
Перестройка и устройство.				Исправленіе.			
Количество.	Въ саженьяхъ.		На сумму.		На сумму.		
	Длина.	Ширина.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	586	94	Перебранъ настиль съ добавленіемъ 300 досокъ новыхъ, сдѣлано подкладокъ на провисшихъ быкахъ, разобраны и собраны вновь перила и колесоотбойныя брусья.
—	—	—	—	—	1	50	Поставлено номерныхъ знаковъ мостовыхъ сооруженій 3 шт.
—	—	—	—	—	1	20	Перемѣнены 2 пластины.
—	—	—	—	—	1	—	Куплено гвоздей для прибивки отставшихъ досокъ.
—	—	—	—	—	369	15	Сдѣланъ новый настиль съ добавленіемъ 173 шт. новыхъ досокъ, перила и колесоотбойныя брусья.
—	—	—	—	—	215	—	Сдѣланы схватки на быкахъ за №№ 2 и 3 и исправлены старыя, съ привинчиваніемъ болтами, перебранъ рѣшетникъ, а въ концахъ прогоновъ сдѣланы пластинные заборы; сдѣланы и положены въ концахъ прогоновъ подкладки.
—	—	—	1054	91	3848	44	
			4903 руб. 35 к.				

1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study.	2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.
3. The third part of the report is a presentation of the results of the study.	4. The fourth part of the report is a discussion of the results and their implications.
5. The fifth part of the report is a conclusion and a list of references.	6. The sixth part of the report is a list of appendices.
7. The seventh part of the report is a list of figures and tables.	8. The eighth part of the report is a list of footnotes.
9. The ninth part of the report is a list of abbreviations.	10. The tenth part of the report is a list of symbols.
11. The eleventh part of the report is a list of acronyms.	12. The twelfth part of the report is a list of units.
13. The thirteenth part of the report is a list of definitions.	14. The fourteenth part of the report is a list of terms.
15. The fifteenth part of the report is a list of symbols.	16. The sixteenth part of the report is a list of symbols.

ВѢДОМОСТЬ

о перестройкѣ и капитальномъ исправленіи мостовыхъ
сооруженій, произведенныхъ въ 1897 г. на шоссейныхъ
дорогахъ Орловской губерніи.

III участокъ.

Воронежское шоссе.

№ № верстъ.	№ № сооружеій.	Наименованіе перегоновъ и сооружеій, находящихся на шоссе.	Передано земству Орловской губерніи.			
			Количество.	Годъ устройства.	Въ саженьяхъ.	
					Длина.	Ширина.
		МОСТОВЫЯ СООРУЖЕНІЯ.				
		<i>Мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ</i>				
		По I перегону	—	—	—	—
		„ II перегону	—	—	—	—
		„ III перегону	—	—	—	—
		„ IV перегону	—	—	—	—
		Итого	—	—	—	—
		<i>Примѣчаніе:</i> перестройки и капитальнаго ремонта въ 1897				

Стоимость работъ, произведенныхъ земствомъ въ 1897 году.						
Количество.	Перестройка и устройство.				Исправленіе.	
	Въ саженьяхъ.		На сумму.		На сумму.	
	Длина.	Ширина.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
—	—	—	—	—	586	48
—	—	—	—	—	306	20
—	—	—	—	—	184	27
—	—	—	—	—	122	71
—	—	—	—	—	1199	66
году не производилось.						

Описаніе произведенныхъ работъ.

Работы состояли въ исправленіи кладки съ добавленіемъ нѣкоторыхъ новыхъ камней, разшивкѣ швовъ цементомъ, прочисткѣ руслъ и исправленіи мощеныхъ лотковъ. На Клементьевской трубѣ I перегона № 10/23, сверхъ того,—въ устройствѣ сливнаго пола и исправленіи штукатурки трубы.

Приложение къ вѣдомости ремонта мостовыхъ сооружений.

По Воронежскому шоссе.

I ПЕРЕГОНЪ.			II ПЕРЕГОНЪ.			III ПЕРЕГОНЪ.			IV ПЕРЕГОНЪ.		
№№ мостовъ.	На сумму.		№№ мостовъ.	На сумму.		№№ мостовъ.	На сумму.		№№ мостовъ.	На сумму.	
	Руб.	Коп.		Руб.	Коп.		Руб.	Коп.		Руб.	Коп.
11/0	34	45	27/37	33	54	32/38	28	75	45/49	8	77
6/19	6	65	26/36	8	42	0/0	30	36	44/48	10	73
3/17	28	45	24/35	5	96	34/0	30	08	48/52	3	21
10/23	432	50	23/0	8	34	35/40	29	60	47/51	3	99
1/0	8	60	22/34	5	94	36/41	9	34	46/50	6	19
2/16	33	60	21/33	8	34	37/42	6	51	48/0	3	60
4/0	18	03	19/31	5	94	38/0	9	47	40/45	13	15
3/22	7	65	18/30	15	14	39/43	7	01	43/47	27	42
8/26	6	85	0/0	44	89	40/0	31	65	49/52	—	65
7/20	4	85	17/29	14	14	33/39	1	50	41/46	13	50
5/18	4	85	16/28	15	14	—	—	—	0/0	30	50
—	—	—	15/27	29	94	—	—	—	40/48	1	—
—	—	—	14/26	29	94	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13/25	15	14	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12/24	64	39	—	—	—	—	—	—
—	—	—	17/19	1	00	—	—	—	—	—	—
Итого.	586	48	—	306	20	—	184	27	—	122	71

В Ъ Д О М О С Т Ь.

суммамъ шосейнаго сбора по Орловской и Елецкой заставамъ съ 1 января по 1-е марта 1897 года.

Въ 1897 году.

Поступило шосейнаго сбора:

а) по Орловскому заставному дому	467 р. 75 ¹ / ₂ к.
б) „ Елецкому „ „	296 р. 02 к.
Итого	763 р. 77 ¹ / ₂ к.

Израсходовано.

1, по Орловскому заставному дому:


а) на ремонтъ заставнаго дома	50 р. 12 коп.
б) „ отопленіе и освѣщеніе его	59 р. 50 коп.
в) „ содержаніе служащихъ и канцелярскіе расходы	304 р. 30 коп.


2, по Елецкому заставному дому:

а) на ремонтъ заставнаго дома	24 р. 75 коп.
б) „ содержаніе служащихъ и канцелярскіе расходы	303 р. 16 коп.
Итого	741 р. 83 коп.

Остатокъ на 1 января 1898 года 21 р. 94¹/₂ к.

Примѣчаніе: Орловская и Елецкая заставы прекратили свое дѣйствіе съ 1 марта 1897 г. согласно постановленія экстреннаго Орловскаго губернскаго земскаго собранія, состоявшагося 26 февраля 1897 года.



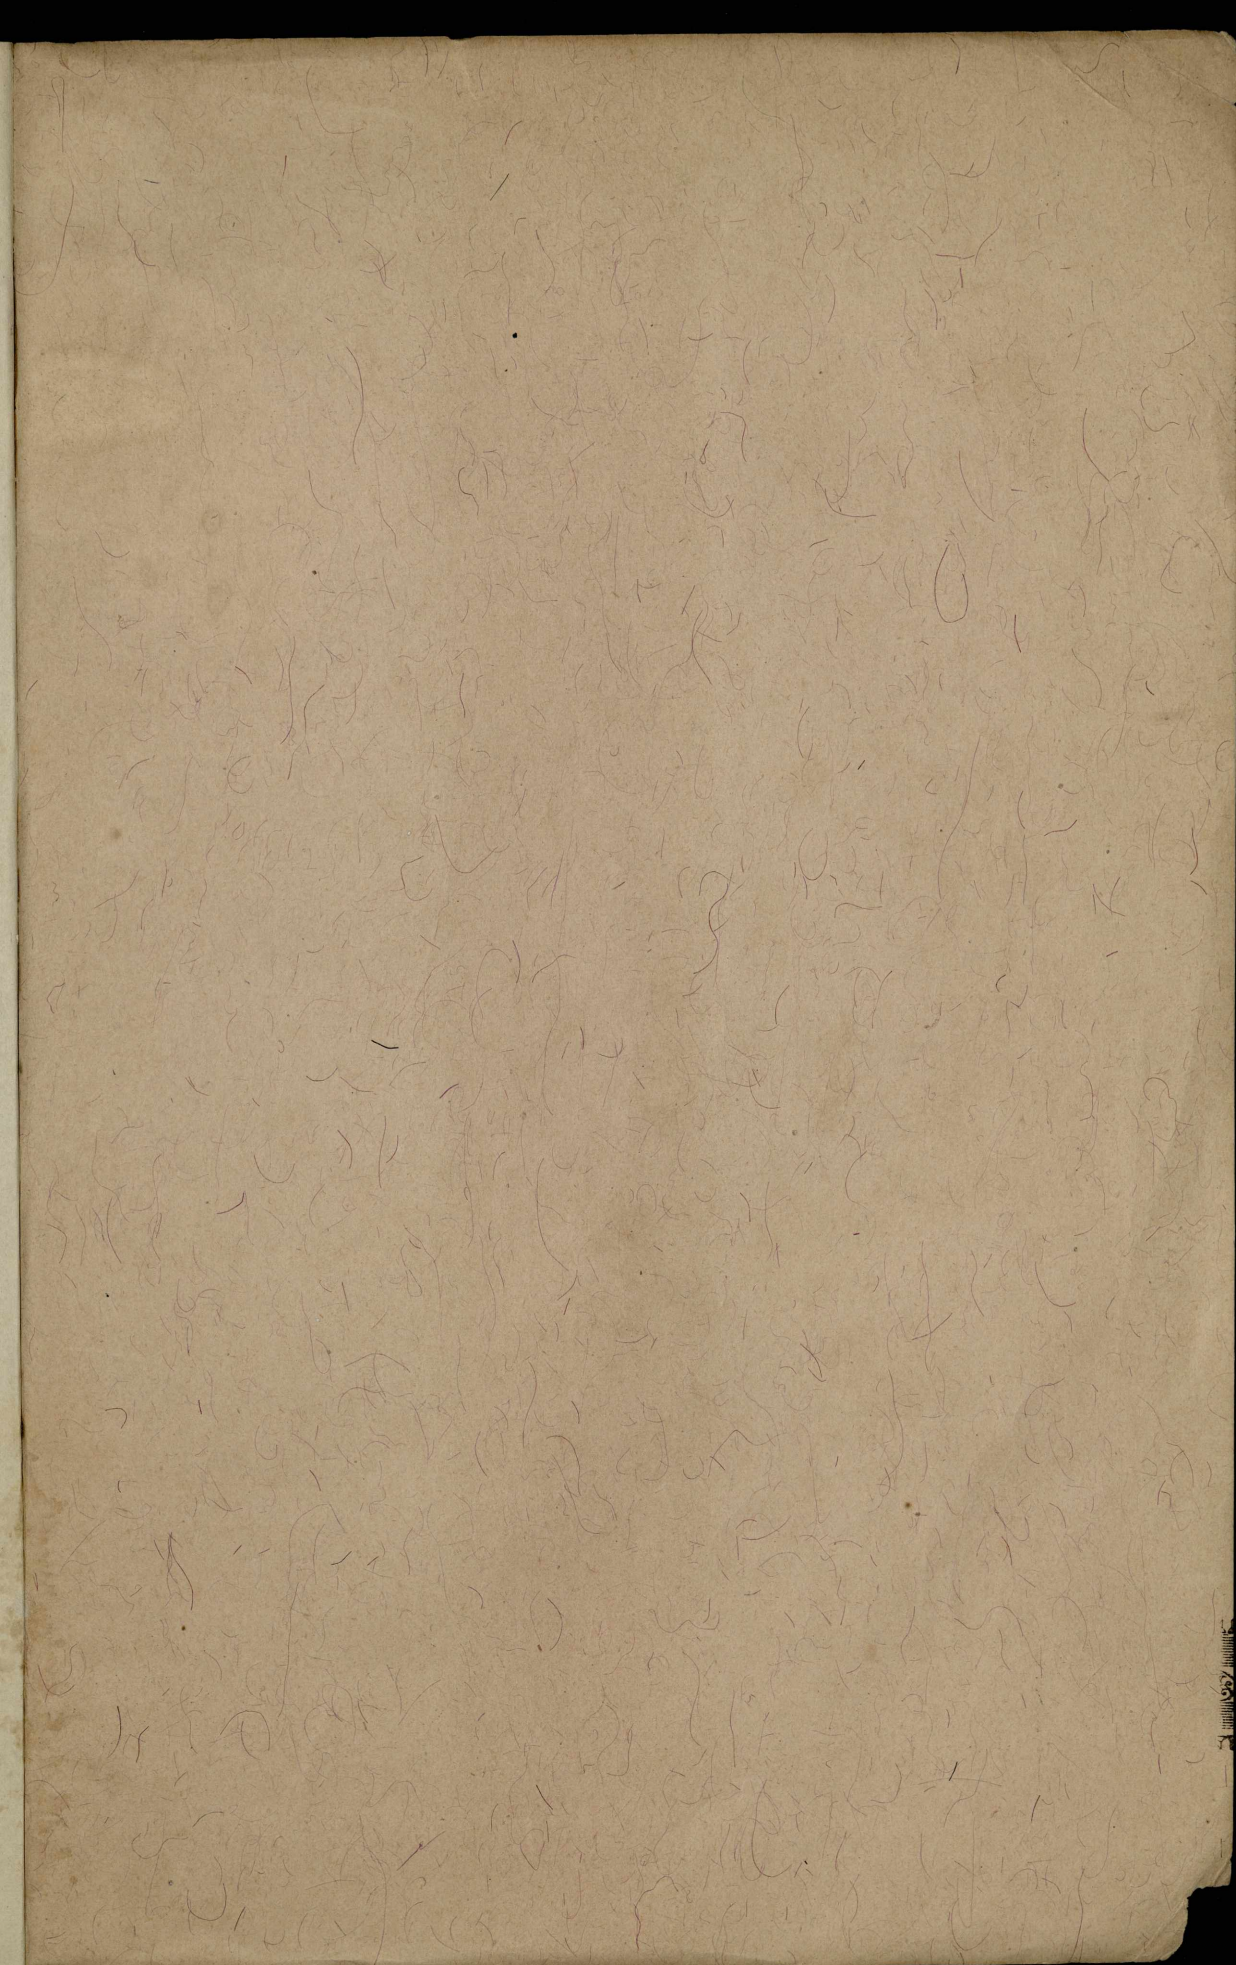

18

