

К338-1

137)

0-88

625

0-88

ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О РАСХОДАХЪ,

произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Правительствомъ
Орловскому Губернскому Земству шоссейныхъ дорогъ
Орловской губерніи

за 1912 годъ.



Типографія С. А. Зайцевой.
г. Орель—1913 г.

0
88

1936/7

1936/7

1936/7

0

К 65.37 ✓
0-88

~~386:625~~
~~0-88~~

ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О РАСХОДАХЪ,

произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Правитель-
ствомъ Орловскому Губернскому Земству шоссейныхъ
дорогъ Орловской губерніи

за 1912 годъ

Учет
Библиотека
1938 г.

7/329

и 16002
КНИГОХРАНИЛИЩЕ
КРАВЕДЪ-ЦЕНТРА
2009

Орл. Центр. Библиотека г. Орла
Отдел выдачи
№
ИМЕНИ Т. КРУПСКОЙ

ПРОВЕРЕНО
1948 г.



КР-2017

Типографія С. Я. Зайцевой. Орель.
1913 годъ.

ОТДЕЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
города Орла
Образования
НАРОДНОГО

Печатать дозволено.

Оборотъ суммъ

къ отчету по ремонтному содержанию переданныхъ
земству Орловской губерніи, казенныхъ шоссей-
ныхъ дорогъ

за 1912 годъ.

№№ статей по порядку.	Оставалось къ 1 января 1912 года.	Сумма.		Поступило въ 1912 году.	Сумма.		ВСЕГО прихода съ остаткомъ.
		Руб.	К.		Руб.	К.	
1	Отъ Правительственной субсидіи *) (Въ этой суммѣ заключается неисполненнаго расхода на сумму 2723 р. 32 к.).	22248	16	а) Правительственной субсидіи . б) Субсидіи отъ общества Юго-Восточныхъ жел. дор. на содержаніе объѣздного шоссе у ст. «Елецъ» . 654 88 130304 88	129650	—	152553 04
2	Отъ субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ *) (Въ этой суммѣ заключается неисполненнаго расхода на сумму 388 р. 28 к.).	2093	09	8848	—	10941 09
3	Спеціальной Правительственной субсидіи на перестройку Клементьевской трубы на Воронежскомъ шоссе	15852	—	—	—	15852 —
4	Отъ постройки моста черезъ рѣку Недну въ г. Кромахъ	6	92	—	—	6 92
5	Случайныхъ поступленій	4182	57	762	33	4944 90
Итого		44382	74	139915	21	184297 95

Израсходовано въ 1912 году.	Сумма.		Остается на 1 января 1912 г.	Сумма.	
	Руб.	К.		Руб.	К.
а) На содержаніе казенныхъ и объѣздного шоссе у ст. «Елецъ»	118967	27	Правительственной субсидіи	14952	66
б) На заготовку матеріаловъ для шоссе за счетъ смѣты 1913 года	5280	81	*) Въ этой суммѣ заключается неисполненнаго расхода на сумму 7678 р. 05 к.		
в) На устройство подъѣздного пути къ ст. Комаричи.	7780	—			
г) На замощеніе Бурачевской гати въ Трубчевскомъ уѣздѣ	4495	—			
д) Уплачено инженеру Рождественскому за составленіе трехъ эскизныхъ проектовъ желѣзныхъ мостовъ на Под.-Хар. шоссе	500	—			
е) Выдано техникамъ по дорожному отдѣлу за работы по пересоставленію смѣты на перестройку городскихъ участковъ шоссе	338	75			
ж) Выдано старшему инженеру дорожного отдѣла В. А. Жежеро, въ возвратъ израсходованныхъ на служебныя поѣздки	238	55			
*) Кромѣ сего израсходовано въ 1911 г. за счетъ смѣты 1912 г. 4813 р. 09 к.	137600	38			
.	8483	12	Субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ	2457	97
.			**) Въ этой суммѣ заключается неисполненнаго расхода 138 руб.		
.			На перестройку Клементьевской трубы	15852	—
.			Отъ постройки моста черезъ рѣку Недну въ г. Кромахъ	6	92
.	826	52	Случайныхъ поступленій	4118	38
.	146910	02	Итого	37387	93
Остатокъ этотъ заключается:					
Въ желѣзныхъ мостовыхъ фермахъ				1593	80
Въ кассѣ Губернской Управы				35794	13
Итого				37387	93
(Въ суммѣ 35794 р. 13 к., заключаются 9696 р. 98 к., разрѣшенные Министерствомъ Путей Сообщенія къ израсходованію на постройку подъѣздного пути къ станц. Малоархангельскъ.)					

No.	Date	Description
1	Jan 1	Balance forward
2	Jan 15	To Cash
3	Jan 20	By Cash
4	Jan 25	To Cash
5	Jan 30	By Cash
6	Feb 5	To Cash
7	Feb 10	By Cash
8	Feb 15	To Cash
9	Feb 20	By Cash
10	Feb 25	To Cash
11	Feb 30	By Cash
12	Mar 5	To Cash
13	Mar 10	By Cash
14	Mar 15	To Cash
15	Mar 20	By Cash
16	Mar 25	To Cash
17	Mar 30	By Cash
18	Apr 5	To Cash
19	Apr 10	By Cash
20	Apr 15	To Cash
21	Apr 20	By Cash
22	Apr 25	To Cash
23	Apr 30	By Cash
24	May 5	To Cash
25	May 10	By Cash
26	May 15	To Cash
27	May 20	By Cash
28	May 25	To Cash
29	May 30	By Cash
30	Jun 5	To Cash
31	Jun 10	By Cash
32	Jun 15	To Cash
33	Jun 20	By Cash
34	Jun 25	To Cash
35	Jun 30	By Cash
36	Jul 5	To Cash
37	Jul 10	By Cash
38	Jul 15	To Cash
39	Jul 20	By Cash
40	Jul 25	To Cash
41	Jul 30	By Cash
42	Aug 5	To Cash
43	Aug 10	By Cash
44	Aug 15	To Cash
45	Aug 20	By Cash
46	Aug 25	To Cash
47	Aug 30	By Cash
48	Sep 5	To Cash
49	Sep 10	By Cash
50	Sep 15	To Cash
51	Sep 20	By Cash
52	Sep 25	To Cash
53	Sep 30	By Cash
54	Oct 5	To Cash
55	Oct 10	By Cash
56	Oct 15	To Cash
57	Oct 20	By Cash
58	Oct 25	To Cash
59	Oct 30	By Cash
60	Nov 5	To Cash
61	Nov 10	By Cash
62	Nov 15	To Cash
63	Nov 20	By Cash
64	Nov 25	To Cash
65	Nov 30	By Cash
66	Dec 5	To Cash
67	Dec 10	By Cash
68	Dec 15	To Cash
69	Dec 20	By Cash
70	Dec 25	To Cash
71	Dec 30	By Cash
72	Jan 1	Balance forward

Пояснительная записка

къ отчету по ремонтному содержанию казенныхъ шоссейныхъ дорогъ,
переданныхъ земству съ 1-го января 1897 года.

За 1912-й (16-й отчетный) годъ.

Расписание суммъ на 1912-й годъ было
составлено въ размѣрѣ 142264 р. 48 к.

Въ этой суммѣ заключается:

- 1) Правительственной субсидіи на содержание шоссе 129650 р. — к.
- 2) Правительственной субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ 8848 р. — к.
- 3) Субсидіи отъ общества Юго-Восточныхъ жел. дор. на содержание объѣздного шоссе у станціи „Елецъ“ 654 р. 88 к.
- 4) Неисполненнаго расхода по смѣтѣ 1911 г. 3111 р. 60 к.

Итого 142264 р. 48 к.

Настоящій отчетъ, составленный соотвѣтственно расписанію, состоитъ изъ четырехъ частей:

I.—Матеріалы, II—работы, III—сооруженія и IV—администрація и выражается общою суммою **132263 р. 48 к.**; изъ нихъ: 123780 р. 36 к. изъ субсидіи 1912 года на содержание шоссе и 8483 р. 12 к. изъ субсидіи 1912 года на перестройку пучистыхъ мѣстъ.

По статьѣ I-й предположено было израсходовать по всеѣмъ тремъ участкамъ:

а) на содержаніе шоссе—41230 р. 82 к., въ дѣйствительности же израсходовано 32687 р. 36 к. + неисполненнаго расхода на 5228 р. 12 к. всего = 37915 р. 48 к., т. е. менѣе смѣтнаго назначенія на 3315 р. 34 к.

и б) на перестройку пучистыхъ мѣстъ на Витебско-Орловскомъ шоссе 6781 р. 78 к. израсходовано же 4832 р. 69 к., менѣе на 1949 р. 09 к.

Выставлено для сплошныхъ розсыпей и мелкаго ремонта шоссе: щебня $628\frac{3}{8}$ к. с., камня $36\frac{3}{8}$ к. с., всего на сумму 31501 р. 05 к. и прочихъ матеріаловъ—хворосту и песку заготовлено на сумму 1186 р. 31 к. Кроме того, на перестройку пучистыхъ мѣстъ выставлено: щебня 34 к. с. на сумму 1739 р. 44 к., камня $27\frac{6}{8}$ к. с. на сумму 2113 р. 25 к. и песку заготовлено на сумму 980 р. Щебень и камень ставился мелкими подрядами: на I участокъ (Витебско-Орловское шоссе) отъ границы Смоленской губ. до гор. Орла известковыхъ, гранитныхъ и фосфоритныхъ породъ; на II участокъ (Подольско-Харьковское шоссе) отъ границы Тульской губ. до гор. Орла, известковыхъ породъ; отъ гор. Орла до гор. Кромъ, известковыхъ и фосфоритныхъ, а отъ гор. Кромъ до гран. Курской губ. фосфоритныхъ породъ; на III участокъ (Воронежское шоссе) щебень ставился исключительно изъ мѣстныхъ известковыхъ породъ. Средняя стоимость одной куб. саж. щебня: а) изъ субсидіи на содержаніе шоссе, составляла въ отчетномъ году на I участокѣ около 62 р., на II участкѣ около 50 р. и на III участкѣ около 23 р., средняя же стоимость одной куб. саж. заготовленнаго въ 1912 г. щебня по всему шоссе около 49 руб.; б) изъ субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ на I участкѣ (Витебско-Орловское шоссе) средняя стоимость одной куб. саж. щебня около 51 руб.

По ст. II-й А) На сезонныя работы: весеннія, лѣтнія, осеннія и зимнія, а равно на розсыпь щебня, инструменты и ремонтъ мостовыхъ по смѣтѣ было предположено израсходовать 26739 р. 36 к., израсходовано же 28118 р. 22 к. + неисполненнаго расхода по розсыпи щебня—1388 р. 63 к. всего = 29506 р. 85 к.; т. е. болѣе смѣтнаго назначенія на 2767 р. 49 к.

Б) На работы капитального ремонта: перестройка шоссе въ мостовую, углубленіе канавъ, срѣзка обочинъ и исправленіе весеннихъ поврежденій, по смѣтѣ было предположено израсходовать 4056 р. 30 к., израсходовано-же 2526 р. 85 к. + неисполненнаго расхода по срѣзкѣ обочинъ—480 р. и углубленію канавъ—353 р. 80 к. всего=3360 р. 65 к. т. е. менѣе на 695 р. 65 к.

В) На содержаніе 10-ти дорожныхъ мастеровъ предположено было израсходовать 6310 р., израсходовано-же 6087 р. 70 к., т. е. менѣе на 222 р. 30 к.

Г) На перестройку пучистыхъ мѣстъ, предположено было по смѣтѣ израсходовать 2454 руб. 50 коп., израсходовано-же 3650 руб. 43 коп., + неисполненнаго расхода 138 руб. всего=3788 р., 43 к., т. е. израсходовано болѣе смѣтнаго назначенія на 1333 руб. 93 коп.

Всего по ст. II-й предположено было по смѣтѣ израсходовать—39560 р. 16 к., израсходовано-же 40383 р. 20 к. + неисполненнаго расхода 2360 р. 43 к. всего=42743 р. 63 к., т. е. болѣе смѣтнаго назначенія на 3183 р. 47 к.

По ст. III-й А) На перестройку мостовъ и трубъ, капитальный и мелкій ремонтъ ихъ, предположено было израсходовать 19093 р. 10 к., израсходовано-же—18256 р. 08 к., т. е. менѣе на 837 р. 02 к.

Б) На ремонтъ и содержаніе зданій и на наемъ помѣщеній для технического отдѣла, предположено было израсходовать—4565 р. 15 к., израсходовано-же 4309 р. 51 к., т. е. менѣе на 255 руб. 64 коп.

В) На второстепенныя дорожныя сооруженія, переѣздныя мостики, сѣзды, тумбы, межевыя, верстовыя и сотенныя знаки и древесныя насажденія ассигновано—2398 р. 47 к., израсходовано-же 1892 р. 53 к. + неисполненнаго расхода по замощенію сѣзда—227 р. 50 к., всего=2120 руб. 03 коп., т. е. менѣе на 278 руб. 44 коп.

Всего по ст. III-й предположено было израсходовать 26056 р. 72 к., израсходовано-же=24458 р. 12 к. + неисполненнаго рас-

хода 227 р. 50 к., всего == 24685 руб. 62 коп., т. е. меньше на 1371 руб. 10 коп.

(Подробныя свѣдѣнія о работахъ по ст. III-й приложены къ сему отчету).

По ст. IV-й. На расходы по содержанию личного состава дорожного отдѣла, содержаніе канцеляріи и разъѣзды ассигновано было 28635 р., израсходовано-же 29902 р. 11 к., т. е. больше на 1267 руб. 11 коп.

Перерасходъ объясняется увеличеніемъ разъѣздовъ, вслѣдствіе хозяйственной заготовки щебня и пробѣговъ военныхъ грузовыхъ автомобилей.

Всего по статьямъ I, II, III и IV предположено было по смѣтѣ израсходовать 142264 р. 48 к.; израсходовано-же 132263 к. 48 к., т. е. меньше на 10001 р., за исключеніемъ изъ этой суммы неисполненнаго расхода на сумму 7816 р. 05 к., отчетный годъ по содержанию шоссе въ 1912 году, заключенъ съ остаткомъ въ суммѣ 2184 руб. 95 коп.

ОТЧЕТНАЯ ВѢДОМОСТЬ

съ показаніемъ характера шоссе и расхода на его
содержаніе

за 1912 годъ.

This image shows a blank page from a ledger or account book. The page is cream-colored and features a faint, light blue grid pattern. The grid consists of approximately 10 vertical columns and 20 horizontal rows. The lines are very thin and light, making the grid barely visible against the paper's texture. There is no text or data written on the page.

ТАБЛИЦА

съ показаніемъ средняго на одну версту расхода
по содержанію шоссейныхъ дорогъ Орловской губ.


за 1912 годъ.

Наименование Шоссе.	Общее протяжение съ мостами въ верстахъ.	Протяжение мостовъ въ верстахъ.	Количество лошадей, проходящихъ въ сутки.	Количество щебня въ куб. саж.	ДАННОСТЬ НА ОДНУ													
					Стоимость материаловъ.		СТОИМОСТЬ РАБОТЪ ОБЫ											
					Щ е б н я.		Зимнія работы.		Весеннія работы.		Лѣтнія работы.		Осеннія работы.		Розсыпь щебня.			
					Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.		
I участокъ. Витебско-Орловское шоссе	193,395	—	—	—	На содер шоссе. 72 35 4 73		9	92	10	53	9	76	5	18	14	20		
					Перестр. пучист. мѣсть. 9 01 16 03													
II участокъ. Подольско-Харьковское шоссе	126,668	—	—	—	108	39	4	31	14	61	15	08	12	94	7	46	31	07
III участокъ. Воронежское шоссе	71,9275	—	—	—	41	22	7	33	14	—	7	98	16	—	6	74	11	51
Средній выводъ по всему шоссе	391,9905	—	—	—	На содер. шоссе. 78 31 5 07		12	19	11	53	11	94	6	21	19	16		
					Перестр. пучист. мѣсть. 4 44 7 89													

ВЕРСТУ ОБЩАГО ПРОТЯЖЕНІЯ ШОССЕ.																									
КНОВЕННАГО РЕМОНТА.										Мосты, здания и дорожныя сооружеія.															
					Ремонтъ.					Перестройка					Администрація.		Общій итогъ въсѣхъ расходовъ.								
Инструменты.		Углубленіе канавъ и сръзка обочинъ.		Исправленіе поврежденій и друпія расходы.		Перестройка шоссе въ мостовую и ремонтъ.		Дорожныя мастера.		Мостовыя и трубы.		Содержаніе и ремонтъ зданий и насипъ поименный для Дорожнаго Отдѣла.		Мостовыя.		Зданій.		Второстепенныхъ дорожныхъ сооружеій.		Администрація.		Общій итогъ въсѣхъ расходовъ.			
Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	Б.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	Р.	Р.	К.
10	98	5	65	—	20	—	—	14	06	33	38	10	66	43	56	—	—	5	75	76	55	327	46		
																								На содержаніе шоссе. Перестр. пучист. мѣсть. 43 95	
7	90	8	09	2	06	—	69	16	53	16	28	9	15	3	57	—	—	4	54	76	91	339	58		
11	43	1	46	—	—	2	37	17	71	—	15	15	10	12	11	—	—	2	85	74	45	242	41		
10	07	5	67	—	77	—	63	15	53	21	75	10	99	24	83	—	—	4	83	76	28	315	76		
																								На содержаніе шоссе. На перестр. пуч. мѣсть. 21 64	
В С Е Г О																					337	40			



и/6009

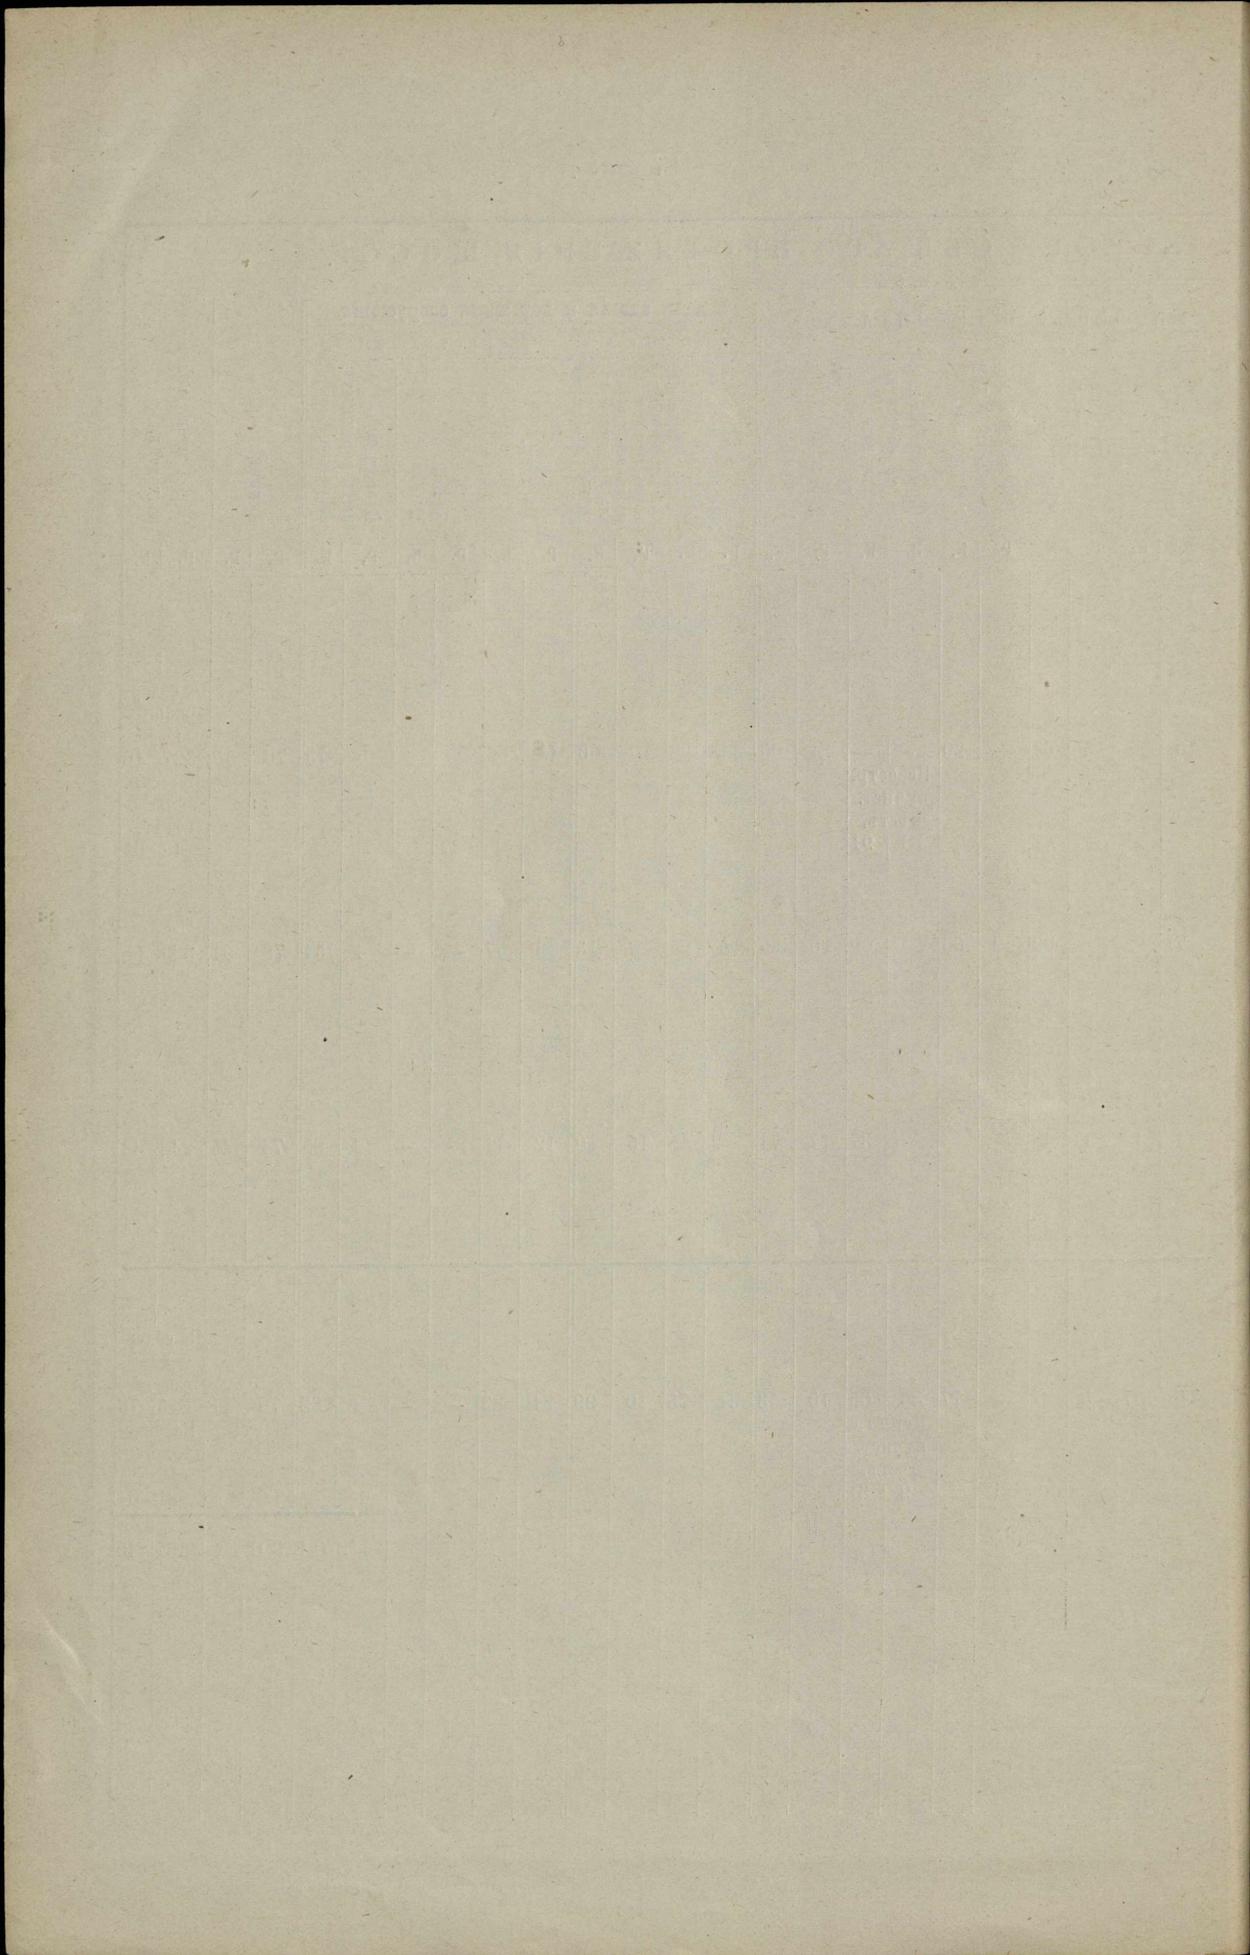

Общій сводъ
оборота каменнаго матеріала
за 1912 годъ.

Наименование перегоновъ.	Верстъ.	Толщина щебеночнаго слоя въ дюймахъ.						Разыграно щебня съ 1896 г по 1 января 1911 года.	Состояніе къ 1 января 1912 г. въ кубическихъ саженихъ.			Поступило въ 1912 г. въ кубич. саж.			
		Щ Е Б Н Я.							На ремонтъ и утолщеніе.	Запаснаго	В С Е Г О.	Камня.	Щебня.	Камня.	
		1896 года.	1899 года.	1902 года.	1905 года.	1908 года.	1911 года.								
I Участокъ. Витебско-Орловское шоссе	193,395	—	3,7	3,7	3,88	3,88	4,11	4,06	6492	345 ² / ₈	—	345 ² / ₈	6 ⁹ / ₁₆	278	49
II Участокъ. Подольско-Харьковское шоссе	126,668	—	5,1	5,9	6,69	6,03	6,10	6,11	5569	107 ² / ₈	—	107 ² / ₈	4 ² / ₈	270 ⁵ / ₈	13 ⁴ / ₈
III Участокъ. Воронежское шоссе	71,9275	—	5,6	5,9	6,03	6,20	6,33	6,23	3430 ¹ / ₈	107 ⁶ / ₈	—	107 ⁶ / ₈	—	132 ⁴ / ₈	17
И Т О Г О . .	391,9905	—	4,5	4,8	4,98	5,03	4,60	5,11	15491 ¹ / ₈	560 ² / ₈	—	560 ² / ₈	10 ¹³ / ₁₆	681 ¹ / ₈	79 ⁴ / ₈
Въ томъ числѣ на перестройку пучистыхъ сотокъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 ⁷ / ₈	—	6 ⁷ / ₈	1 ⁶ / ₈	34	27 ⁶ / ₈

Употреблено въ 1912 г. въ кубическихъ саженихъ.				Осталось къ 1-му января 1913 года.		Предполож. заготовить въ 1913 г. въ кубич. саж.		Предполагается имѣть въ 1913 г. въ кубическихъ саженихъ.					Примѣчаніе.
Щ Е Б Н Я.				Камня.	Щебня.	Камня.	Щебня.	Щ Е Б Н Я.					
На ремонтъ.	На утолщеніе.	В С Е Г О.	Камня.					На ремонтъ.	На утолщеніе.	Запаснаго.	В С Е Г О.	Камня.	
75 ⁷ / ₈	189 ² / ₈	265 ¹ / ₈	397 ⁸ / ₈	358 ¹ / ₈	15 ¹¹ / ₁₆	154 ⁵ / ₈	337 ⁷ / ₈	70	163 ³ / ₈	279 ³ / ₈	512 ⁶ / ₈	49 ⁹ / ₁₆	
64	202 ³ / ₈	266 ³ / ₈	16 ⁶ / ₈	111 ⁴ / ₈	1	178 ² / ₈	7	70	134 ⁷ / ₈	84 ⁷ / ₈	289 ⁶ / ₈	8	
27 ⁷ / ₈	72 ³ / ₈	100 ² / ₈	12	140	5	72 ⁵ / ₈	54	26	117	69 ⁵ / ₈	212 ⁵ / ₈	59	
167 ⁶ / ₈	464	631 ⁶ / ₈	68 ⁵ / ₈	609 ⁵ / ₈	21 ¹¹ / ₁₆	405 ⁴ / ₈	94 ⁷ / ₈	166	415 ² / ₈	433 ⁷ / ₈	1015 ¹ / ₈	116 ⁹ / ₁₆	
—	40 ⁷ / ₈	40 ⁷ / ₈	31	2 ³ / ₈	—	24	32 ³ / ₈	—	26 ³ / ₈	—	26 ³ / ₈	32 ³ / ₈	

ВѢДОМОСТЬ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ соору-
женій на **Витебско-Орловскомъ** шоссе въ пре-
дѣлахъ Орловской губерніи

за 1912 годъ.

№№ верст.	№№ сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
I ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ границы Смоленской губ. до ст. Жуковой.							
11	40	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ настиломъ	—	1892	25,80	4,00	2,25
12	41	Тоже	—	1892	25,63	4,00	2,45
16	42	Деревянный мостъ накатный, шоссированный	—	1900	6,00	2,67	1,70
18	44	Тоже съ открытымъ поломъ	—	1908	2,92	2,67	0,70
19	45	Тоже	—	1891	8,00	4,00	1,75
20	47	Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1903	5,00	2,67	0,96
II ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Жуковой до ст. Угость.							
2	48	Деревянный мостъ накатный, шоссированный	—	1904	5,33	4,00	1,05
3	49	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1903	5,00	2,67	0,83

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименование работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
20,50	3,00	2,25	2604	35	—	—	Перестроенъ.
—	—	—	—	—	2	60	Мелкій ремонтъ 6 болтовъ и поставлены 2 шаг. столба.
—	—	—	—	—	19	—	Ремонтированъ смѣною 18 штукъ наката, 2 прижимовъ и упорныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	23	40	Ремонтированъ смѣною 8 ступень, 2-хъ насадокъ и 4-хъ упорныхъ тумбъ.
8,00	3,00	1,75	899	72	—	—	Перестроенъ
—	—	—	—	—	88	49	Смѣнено 40 накатинъ, 7½ саж. прижимовъ, 10 саж. периль, 4 упорныхъ и 2 отлетныхъ тумбы.
—	—	—	—	—	63	69	Ремонтированъ смѣною прижимовъ и перильныхъ насадокъ, 4 упорныхъ и 6 отлетныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	90	21	Ремонтированъ смѣною 30 шт. наката, прижимовъ и перильныхъ насадокъ, 4 упорн. и 5 отлетныхъ тумбъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженихъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
5	50	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ	—	1897	9,20	4,00	1,75
6	51	Деревянный мостъ балочный съ открытымъ накатомъ	—	1902	3	2,66	0,61
9	52	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1904	8,00	3,00	1,35
10	53	Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1902	25,00	3,00	2,15
12	55	Тоже	—	1905	3,00	2,67	0,64
13	56	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	7,00	3,00	1,73
13	57	Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1903	12,00	3,00	2,47
14	58	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	6,00	2,67	1,09
16	59	Деревянный мостъ, съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1903	10,00	3,00	1,54
17	60	Деревянный мостъ, балочный, съ двойнымъ досчатымъ поломъ	—	1907	24,00	3,00	3,67

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженихъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	121	97	Ремонтированъ смѣною череповыхъ брусевъ, 58 досокъ и 4-хъ отлетныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	9	30	Ремонтированъ смѣною 14 накатинъ и 5 п. с. прогон.
—	—	—	—	—	267	04	Капитально ремонтированъ смѣною 95 накатинъ, 5 п. с. прижимовъ, 17 п. с. перильн. насадокъ одной сваи, 4 упорн. и 12 отлетныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	296	09	Ремонтированъ смѣною 137 накатинъ и 5 тумбъ.
—	—	—	—	—	41	99	Ремонтированъ смѣною 18 накатинъ и одной тумбы.
—	—	—	—	—	122	60	Смѣнено 50 шт. наката.
—	—	—	—	—	251	32	Смѣнено 111 накатинъ, 12 пог. с. прижимовъ и 8 тумбъ.
—	—	—	—	—	102	35	Смѣнено 50 накатинъ.
—	—	—	—	—	137	61	Смѣнено 42 накатины, 10 ступльевъ, 2 наскдки и 8 тумбъ.
—	—	—	—	—	2	38	Смѣнено 5 досокъ въ половомъ настиль.

№№ веретъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
18	62	Деревянный мостъ, балочный, съ досчатымъ поломъ	—	1904	12,00	3,00	1,35
19	63	Деревянный мостъ балочный, съ двойнымъ досчатымъ поломъ	—	1911	17,00	4,00	2,17
III ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Угость до ст. Шахматы.							
1	64	Деревянный мостъ, балочный, съ досчатымъ поломъ	—	1903	4	2,67	1,02
2	65	Тоже	—	1891	16,00	4,00	2,00
2	66	Деревянный мостъ, съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1902	6,00	2,67	0,82
4	67	Деревянный мостъ, балочный, съ досчатымъ поломъ	—	1891	32,90	4,00	3,20
8	686	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1902	5,00	2,64	0,90

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	133	29	Смѣнено 30 накатинъ, 10 стульевъ, 2 насадки и поставлено 3 вспомогат. прогона и 4 сваи.
—	—	—	—	—	1	40	Мелкій ремонтъ, оправка откосовъ.
—	—	—	—	—	45	75	Смѣнено 24 накатины, 5 тумбъ и поставлена 1 вспомогательная свая и 8 пог. саж. прогоновъ.
—	—	—	—	—	107	19	Смѣнено 49 досокъ въ половомъ настиль, 30 шт. рѣшетнику, 24 п. с. прижимовъ и 24 п. с. перильныхъ насадокъ поставлено 7 вспомогательныхъ свай и 30 пог. саж. прогоновъ.
—	—	—	—	—	84	03	Смѣнено 44 шт. наката, 6 тумбъ и поставлено 3 вспомогат. стула и 5 п. с. прогоновъ.
—	—	—	—	—	200	37	Укрѣпленъ половой настиль добавленіемъ 54 рѣшетинъ, 83 досокъ, 55 п. с. перильныхъ насадокъ, 51 п. с. прижимовъ, 6 подкосовъ и 5 свай.
—	—	—	—	—	100	87	Смѣнено 34 шт. наката и 1 подушка.

№ верст.	№ сооруженій.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
9	69	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1903	15,00	3,00	3,13
9	70	Тоже	—	1902	6,10	2,67	1,35
10	71	Тоже	—	1903	4,00	2,67	0,70
11	72	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1904	6,00	3,00	1,12
13	73	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1900	3,00	2,67	0,78
13	74	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1903	5,00	2,67	1,12
14	75	Тоже	—	1901	6,00	2,67	1,34
15	76	Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1906	20,00	3,00	3,35
16	77	Деревянный мостъ подкосной системы, съ досчатымъ поломъ	—	1906	12,00	3,00	1,95

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженахъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	317	48	Капитально отремонтированъ смѣною 100 штукъ наката, 10 ступльевъ, 2 насадокъ 10 свай, 30 п. с. прижимовъ и сдѣланы 4 подкоса.
—	—	—	—	—	92	71	Смѣнено 41 накатина, и поставлены 3 вспомогательныя свай.
—	—	—	—	—	80	61	Капитально отремонтированъ: смѣною 32 накатинъ, 8 ступльевъ, 2 насадокъ и поставлены 3 вспомогат. свай.
—	—	—	—	—	102	36	Капитально отремонтированъ: смѣною 40 шт. наката, 8 ступльевъ, 2 насадокъ, 6 п. с. перильн. насад., 3 п. с. прижимовъ, 2 тумбъ и постановкою 5 вспомогательныхъ стоекъ у свай.
—	—	—	—	—	55	10	Ремонтированъ смѣною 11 шт. накатника и положено 2 вспомогательныхъ прогона.
—	—	—	—	—	97	32	Капитально отремонтированъ смѣною 8 ступльевъ, 2-хъ насадокъ, 52 шт. накатинъ и поставлено 6 вспомогат. стоекъ у свай.
—	—	—	—	—	83	86	Ремонтированъ смѣною 42 накатинъ и подставкою стоекъ вспомогательныхъ у свай.
—	—	—	—	—	30	30	Смѣнено 10 досокъ въ половомъ настиль.
—	—	—	—	—	12	51	Смѣнено 13 шт. накатника.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
16	79	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1900	6,00	2,67	1,12
17	80	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1902	6,00	2,67	1,00
18	81	Тоже	—	1902	6,00	2,67	1,38
19	82	Тоже	—	1902	5,00	2,67	0,70
IV ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Шахматы до ст. Глинищево.							
1	83	Деревянный балочный мостъ, съ открытымъ накатомъ	—	1899	5,00	2,67	0,70
2	84	Тоже	—	1903	5,00	2,67	1,15
3	85	Тоже	—	1906	10,00	3,00	1,50
4	86	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1899	6,00	2,67	1,18
5	88	Тоже	—	1899	5,87	8 ар.	1,38
8	90	Тоже	—	1899	6,00	2,67	1,33
8	91	Тоже	—	1899	6,00	2,67	1,00

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	52	—	Смѣнено 29 накатинъ и поставлены 4 вспомогательныхъ стойки у свай.
—	—	—	—	—	61	18	Смѣнено 44 шт. наката, 2,33 п. с. прогона, 12 п. с. перильныхъ насадокъ, 6 п. с. прижимовъ и 4 тумбы.
—	—	—	—	—	29	46	Смѣнено 34 шт. наката.
—	—	—	—	—	14	50	Смѣнено 11 накатинъ.
IV ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Шахматы до ст. Глинищево.							
—	—	—	—	—	14	89	Смѣнено 8 стульевъ, 2 насадки, 2 накатины и положены 2 вспомогательныхъ прогона.
—	—	—	—	—	101	58	Ремонтированъ смѣною 8 стульевъ, 2-хъ насадокъ, 40 накатинъ и уложено 2 вспомогат. прогона.
—	—	—	—	—	23	16	Смѣнено 10 накатинъ и поставлено 3 вспомогательныя стойки къ сваямъ.
—	—	—	—	—	4	—	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	11	44	Положены 6 п. с. вспомогательныхъ прогоновъ и 1 свая.
—	—	—	—	—	12	88	Поставлено 6 вспомогательныхъ стоекъ къ сваямъ.
—	—	—	—	—	10	60	Поставлено 5 вспомогательныхъ стоекъ къ сваямъ.

№ верстг.	№ сооруженій.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
9	93	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ	—	1904	12,00	3,00	2,16
11	96	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1903	9,00	3,00	1,67
13	98	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1902	4,00	2,67	0,90
V ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Глинищево до г. Брянска.							
1	101	Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ настиломъ	—	1891	20,00	4,05	2,67
5	103	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	6,00	2,67	1,15
8	105	Тоже	—	1898	4,00	2 ² / ₃	0,90
10	106	Тоже	—	1904	3,00	3,00	0,85
13	108	Деревянный мостъ балочный, накатный шоссированный	—	1901	5,00	2,67	1,20
15	109а	Тоже	—	1898	4,00	4,00	0,67
15	109б	Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ	—	1906	20,00	3,00	3,05
16	111б	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ	—	1904	17,00	3,00	3,69
18	112	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	5,00	2,67	1,30

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	96	70	Смѣнено 41 шт. наката.
—	—	—	—	—	49	24	Смѣнено 38 шт. наката.
—	—	—	—	—	35	21	Смѣнено 20 шт. наката.
V ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Глинищево до г. Брянска.							
—	—	—	—	—	196	18	Смѣнено 62 доски въ половомъ настиль и укрѣпленъ мостъ скобами и временными стойками съ подкосами.
—	—	—	—	—	25	78	Смѣнено 8 ступльевъ и 2 насадки.
—	—	—	—	—	9	80	Смѣнено 8 ступльевъ.
—	—	—	—	—	2	50	Мелкій ремонтъ—смѣна тумбъ.
—	—	—	—	—	7	53	Положены вспомогательн. прогоны.
—	—	—	—	—	14	72	Смѣнено 6 ступльевъ.
—	—	—	—	—	15	04	Смѣнено 4 доски и отремонтированъ половой настиль.
—	—	—	—	—	58	30	Нарощено 9 шт. свай и отремонтированъ половой настиль.
—	—	—	—	—	147	30	Смѣнено 60 шт. наката и 10 п. с. прижимовъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
VIII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Карачева до ст. Коробово.							
2	133	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ	—	1902	23,00	4,20	2,78
5	135	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1898	5,10	4,00	1,00
6	136	Тоже	—	1898	4,00	2,67	0,78
8	137	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1899	5,10	2,67	1,20
9	138	Тоже	—	1898	4,00	2,67	0,66
10	139	Тоже	—	1901	5,15	2,70	1,05
12	140	Тоже	—	1902	6,00	2,67	1,00
17	141	Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1902	4,00	2,67	1,74
IX ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Коробово до ст. Горки.							
1	145	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	10,00	3,00	2,20

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	85	95	Ремонтированъ нарощеніемъ 6 свай, 18 п. с. перильныхъ насадокъ, 12 п. с. прижимовъ и упорныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	29	40	Смѣнены стулья 12 шт., береговья насадки 8 п. с.
4,00	3,00	0,78	428	73	—	—	Перестроенъ.
—	—	—	—	—	1	80	Смѣнены 2 стула.
—	—	—	—	—	22	82	Смѣнены 8 стульевъ и 4 пог. с. насадокъ.
6,00	3,00	1,10	594	68	—	—	Перестроенъ.
—	—	—	—	—	24	65	Смѣнены стулья 4 шт., перильныя насадки 6 пог. саж.
—	—	—	—	—	6	20	Положены вспомогательныя прогоны 9 пог. саж.
—	—	—	—	—	376	—	Капитально ремонтированъ смѣною 72 шт. наката, перильныхъ насадокъ и 10 свай.

№№ верстг.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
4	147	Деревянный мостъ балочный съ шоссированнымъ поломъ	—	1901	5,00	2,67	1,15
5	148	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	3,00	2,67	0,75
6	149	Тоже	—	1902	5,00	2,67	0,87
8	151	Тоже	—	1898	4,00	2,67	1,00
8	152	Тоже	—	1901	4,00	2,67	0,97
9	153	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1902	5,00	2,67	1,00
10	155	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1898	5,0	2,67	0,92
11	156	Тоже	—	1898	3,10	2 ² / ₃	0,77
12	157	Тоже	—	1898	3,00	2,67	0,80
13	158	Тоже	—	1901	3,00	2,67	0,80
13	159	Тоже	—	1901	4,10	2,72	1,00
16	161	Тоже	—	1897	5,00	2,66	1,03
16	162	Тоже	—	1897	3,00	2 ² / ₃	0,65

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	1	05	Положены вспомогательн. прогоны.
—	—	—	272	58	—	—	Перестроены.
—	—	—	—	—	15	05	Положены вспомогательн. прогоны.
—	—	—	—	—	9	10	Поставлено 4 новыхъ стула.
—	—	—	313	30	—	—	Перестроены.
—	—	—	—	—	129	70	Смѣнено наката 36 шт., 3 пог. с. перильныхъ насадокъ, упорныя тумбы и нарощено свай 8 шт.
—	—	—	—	—	24	45	Смѣнены стулья 8 шт., береговья насадки 2 шт.
—	—	—	—	—	2	65	Поставлены 2 вспомогат. стойки у свай.
—	—	—	—	—	25	35	Смѣнены стулья и береговья насадки.
—	—	—	—	—	6	40	Положено 8 пог. саж. вспомогат. прогоновъ.
—	—	—	—	—	10	60	Поставлено 3 вспомогат. стойки у свай.
—	—	—	—	—	2	55	Поставлены 4 стула у свай.
—	—	—	—	—	2	65	Поставлены 4 вспомогат. стула у свай.

№№ верстг.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
Х ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Горки до ст. Ледна.							
1	163	Деревянный мостъ	—	1889	18,00	4,00	3,00
3	164	Деревянный мостъ балочный съ шоссированнымъ накатомъ	—	1899	3,00	2,67	0,72
6	165	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ	—	1889	23,60	4,00	2,20
9	166	Тоже	—	1889	12,35	4,00	2,70
11	168	Деревянный мостъ балочный съ шоссированнымъ накатомъ	—	1900	9,00	3,00	1,44
12	169	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1897	3,00	2,67	0,40
14	170	Тоже	—	1900	3,00	2,67	0,40
16	171	Тоже	—	1901	7,00	2,67	1,90
16	172	Тоже	—	1889	10,00	4,00	1,45
16	173	Тоже	—	1900	6,00	2,67	1,30
18	174	Тоже	—	1903	3,00	2,67	0,83
20	176	Деревянный мостъ балочный съ шоссированнымъ накатомъ	—	1903	6,00	2,67	1,30

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	26	10	Нарощены 2 сваи, смѣнено 4 рѣшетины и 8 досокъ.
—	—	—	—	—	3	80	Поставлены 4 стула новыя.
23,00	3,00	—	2682	52	—	—	Перестроены.
—	—	—	—	—	33	15	Ремонтированъ половой настилъ.
—	—	—	—	—	6	44	Смѣнено 6 стульевъ.
—	—	—	—	—	2	20	Смѣнено 4 стула.
—	—	—	238	08	—	—	Перестроены.
—	—	—	—	—	493	95	Смѣненъ накатъ, прижимы, концевыя прогоны 10 свай и 12 тумбъ.
—	—	—	—	—	2	20	Смѣнено 2 стула.
—	—	—	—	—	35	60	Смѣнено 8 стульевъ и положены вспомогат. прогоны.
—	—	—	—	—	2	20	Поставлены 4 стула.
—	—	—	—	—	15	20	Поставлено 8 вспомогат. стоекъ у свай и 1 прогонъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
20	177	Тоже	—	1903	5,00	2,67	0,66
22	178	Тоже	—	1899	3,00	2,67	0,92
23	179	Тоже	—	1876	10,00	4,00	2,17
24	181	Тоже	—	1899	3,00	2,67	0,65
		На мелкій ремонтъ по X-му перегону (оставшагося лѣсного матеріала)	—	—	—	—	—
XI ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ледны до г. Орла.							
6	184	Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1898	11,00	4,00	1,80
8	186	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1891	9,00	4,00	1,85
8	187	Тоже	—	1900	18,00	4,00	4,50
10	188	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ поломъ	—	1891	30,45	4,00	5,24

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	25	10	Смѣнено 3 накатины, положены 4 вспомогательн. прогона и 10 ступень.
—	—	—	—	—	5	40	Подставлены 4 стула.
—	—	—	—	—	11	29	Смѣнено 9 п. с. перильныхъ насадокъ и 2 упорныя тумбы.
—	—	—	—	—	6	50	Поставлено 4 стула и 2 прижимныхъ тумбы.
—	—	—	—	—	60	—	
—	—	—	—	—	109	55	Смѣнено 33 шт. досокъ въ половомъ настиль, 20 рѣшетинъ и положены 4 вспомогательн. прогона.
—	—	—	—	—	11	85	Нарощено 4 сваи, смѣнено 2 стула и положенъ вспомогат. прогонъ.
—	—	—	—	—	116	79	Въ среднемъ большомъ пролетѣ построенъ вспомогательный устой и отремонтированъ половой настиль.
—	—	—	—	—	139	80	Смѣнено 60 досокъ въ половомъ настиль и часть рѣшетника.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженихъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
10	189	Деревянный балочный мостъ, накатный шоссированный	—	1901	4,00	2,67	1,05
12	190	Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1891	10,00	4,00	1,53
14	191	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1900	9,00	3,00	1,53
16	193	Тоже	—	1897	3,10	2,67	0,67
		На мелкій ремонтъ по XI перегону (остатокъ лѣсного матеріала)	—	—	—	—	—
Всего			—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженихъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	165	05	Капитально отремонтированъ смѣною 8 пог. саж. прогоновъ, 2 насадокъ, 42 накатинъ, 6 пог. саж. прижимовъ, 8 ступень и концы моста обшиты тесомъ.
—	—	—	—	—	4	40	Подвено 4 стула.
—	—	—	—	—	2	70	Подставлено 3 сваи.
—	—	—	—	—	1	10	Подведено 4 стула.
—	—	—	—	—	61	65	
—	—	—	8406	93	6442	69	
			14849 р. 62 к.				

Date	Description
1870	...
1871	...
1872	...
1873	...
1874	...
1875	...
1876	...
1877	...
1878	...
1879	...
1880	...
1881	...
1882	...
1883	...
1884	...
1885	...
1886	...
1887	...
1888	...
1889	...
1890	...
1891	...
1892	...
1893	...
1894	...
1895	...

В Ъ Д О М О С Т Ъ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ соору-
женій на Подольско-Харькоскомъ шоссе въ пре-
дѣлахъ Орловской губерніи

за 1912 годъ.

№№ верстг.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
I ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ границы Тульской губ. до гор. Мценска.							
2	1/214	Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ настиломъ	—	1884	7,00	3,33	—
3	2/215	Каменная труба съ чугуннымъ полуцилиндрическимъ сводомъ . . .	—	1847	25,00	1,20	1,65
5	3/216	Полуцилиндрическая труба . . .	—	1847	16,00	0,65	0,70
6	4/217	Рельсовый мостъ съ водобойнымъ колодцемъ	—	1897	4,20	1,20	1,35
7	5/218	Полуцилиндрическая труба . . .	—	1847	21,00	1,18	1,60
II ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Мценска до ст. Ильковой.							
2	7/223	Кирпичная труба	—	188 ^{1/2}	26,00	1,65	2,40
4	8/224	Деревянный мостъ на каменныхъ стѣнкахъ	—	1893	0,9	2,46	0,7
5	9/225	Деревянный мостъ на каменныхъ стѣнкахъ	—	1893	3,00	3,33	0,65

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.	
Перестройка.			Исправленіе.					
Въ саженахъ.			На сумму.					
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.		
—	—	—	—	—	23	25	Произведенъ мелкій ремонтъ: уложены 4 дополнительныхъ прогона и отремонтированы рѣшетникъ и настилъ съ добавкою новыхъ 3 пластинъ и 14 шт. досокъ.	
—	—	—	—	—	1	88	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ трубы и мощеніе русла оврага.	
—	—	—	—	—	5	81	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ трубы.	
—	—	—	—	—	2	70	Обшиты концы накатника тесомъ.	
—	—	—	—	—	8	10	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ трубы и мостовой подъ трубою и ниже ея.	
—	—	—	—	—	9	87	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ трубы съ расчисткою и заливкою цементомъ мелкихъ трещинъ.	
—	—	—	—	—	12	74	Произведенъ мелкій ремонтъ цементомъ кирпичныхъ стѣнокъ и обшито торцевъ накатника тесомъ.	
—	—	—	—	—	13	14	Сдѣланъ мелкій ремонтъ цементомъ кирпичныхъ стѣнокъ моста и обшиты концы накатника тесомъ.	

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
6	10/226	Деревянный балочный мостъ шоссированный	—	1895	4,00	3,33	0,65
8	11/227	Полуцилиндрическая труба на каменныхъ стѣнкахъ съ чугуннымъ сводомъ	—	1887	21,4	0,90	0,95
10	12/228	Деревянный мостъ на каменныхъ стѣнкахъ	—	1895	4,30	3,33	1,08
12	13/229	Каменная труба съ чугуннымъ полуцилиндрическимъ сводомъ	—	1847	13,00	0,60	0,60
14	14/230	Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ на пластинахъ	—	1887	18,00	4,00	5,65
15	15/231	Рельсовый мостъ на каменныхъ стѣнкахъ, съ досчатымъ поломъ на пластинахъ	—	1891	3,28	1,00	1,00
III ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ильковой до ст. Ивановской.							
1	16/232	Деревянный балочный мостъ шоссированный	—	1894	7,00	3,50	1,90

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	30	24	Поставлено 11 шт. новыхъ стульевъ и произведенъ мелкій ремонтъ накатника.
—	—	—	—	—	7	39	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ трубы цементомъ.
—	—	—	—	—	9	14	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ моста цементомъ.
—	—	—	—	—	9	14	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ трубы цементомъ и мощенаго русла.
—	—	—	—	—	669	23	Произведенъ капитальный ремонтъ верхняго строенія моста согласно смѣты: перебраны рѣшетникъ и досчатый настиль моста съ добавленіемъ 115 шт. пластинъ и 360 п. с. досокъ, добавлено къ периламъ 11 п. с. новыхъ бревенъ и обшиты торцы пластинъ тесомъ.
—	—	—	—	—	32	84	Перебранъ рѣшетникъ и настиль съ добавленіемъ новыхъ 6 шт. пластинъ и 10 шт. досокъ.
—	—	—	—	—	33	89	Произведенъ мелкій ремонтъ съ добавленіемъ 4 дополнительныхъ прогоновъ и нарощеніемъ 9 свай.

№№ верстг.	№№ сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженихъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
4	18/234	Деревянный мостъ, арочный системы, на каменныхъ устояхъ . . .	—	1895	11,5	4,80	2,38
9	23/239	Деревянный мостъ подкосной системы	—	1887	20,05	4,00	6,25
16	29/245	Деревянный, на каменныхъ устояхъ, мостъ съ однимъ быкомъ	—	1896	27,01	4 ² / ₃	1,6
IV ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ивановской до г. Орла.							
1	30/246	Деревянный мостъ шоссированный	—	1896	3,00	3,33	0,97
3	31/247	Тоже	—	1896	3,00	3,33	0,85
13	38а	Деревянный мостъ у Московскихъ воротъ	—	1899	8,00	3,00	2,20

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименование работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженихъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	51	20	Произведена пропитка деревянныхъ арокъ, прогоновъ, сержекъ и схватокъ моста „эксикаторомъ“.
—	—	—	—	—	217	47	Произведенъ мелкій ремонтъ верхняго строенія: перебранъ рѣшетникъ и половой настилъ съ добавленіемъ 20 шт. пластинъ и 60 досокъ, положенъ 1 дополнительный прогонъ, подтянуты подкосы скобами и мостовые болты.
—	—	—	—	—	82	85	Произведенъ мелкій ремонтъ настила съ добавленіемъ 60 шт. сосновыхъ досокъ; подтянуты болты.
—	—	—	—	—	84	37	Произведенъ мелкій ремонтъ со смѣною 10 шт. ступень и 5 шт. свай, отремонтированъ накатникъ и прижимные брусья и обшиты концы накатника тесомъ.
—	—	—	—	—	8	60	Обшиты концы накатника тесомъ.
—	—	—	—	—	30	45	Произведенъ мелкій ремонтъ перилъ съ окраскою ихъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
V ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Орла до ст. Салтыки.							
8	42/4	Деревянный мостъ, на каменныхъ устояхъ, съ рельсовыми переводами, съ досчатымъ настиломъ	—	1888	2,86	3 ¹ / ₃	0,60
8	43/5	Кирпичная труба	—	1852	9,75	1,5	1,10
11	44/6	Деревянный мостъ арочной системы	—	1856	24,00	4,79	5,00
17	48/10	Кирпичная труба	—	1852	14,30	1 ¹ / ₂	0,33
—	49/11	Тоже	—	1852	14,30	1,50	1,10
VI ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Салтыки до г. Кромъ.							
1	52/14	Деревянная труба	—	1886	1,00	3 ¹ / ₃	—
2	53/15	Деревянный мостъ шоссированный	—	1883	4,00	4,00	0,80

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.				Исправленіе.			
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	7	70	Сдѣланъ мелкій ремонтъ настила и кирпичныхъ стѣнокъ моста.
—	—	—	—	—	1	90	Проконопачены и осмолены швы досчатого лотка ниже трубы.
—	—	—	—	—	28	87	Сдѣланъ мелкій ремонтъ цементомъ устоевъ моста.
—	—	—	—	—	12	92	Произведены окончатка и осмолка швовъ досчатого лотка ниже трубы и мелкій ремонтъ цементомъ стѣнокъ трубы.
—	—	—	—	—	19	13	Произведена оштукатурка цементомъ стѣнокъ трубы до горизонта высокой воды и мелкій ремонтъ крыльевъ.
—	—	—	—	—	4	48	Поставлены деревянные распорки между стѣнками трубы и произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ.
—	—	—	—	—	31	60	Произведенъ мелкій ремонтъ съ положеніемъ 2-хъ новыхъ колесоотбойныхъ брусевъ и 11 шт. новыхъ накатинъ и обшиты концы накатника тесомъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
3	54/16	Деревянный мостъ балочный съ досчатымъ настиломъ	—	1887	20,00	4,33	3,00
5	57/19	Деревянный мостъ шоссированный	—	1884	5,00	3,33	1,00
8	61/23	Деревянный мостъ подкосной системы	—	1887	40,00	4,00	4,20
10	62/24	Деревянный мостъ шоссированный	—	1852	3,00	2,67	0,90
11	63/25	Деревянный балочный мостъ шоссированный	—	1834	5,00	3,33	1,00
12	64/26	Деревянный мостъ съ пластино-досчатымъ поломъ	—	1887	13,50	4,00	2,66
VII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Кромъ до ст. Гастомли.							
2	72/37	Деревянный мостъ шоссированный	—	1905	3,00	3,00	0,5
3	73/38	Тоже	—	1885	3,5	3,33	0,8
3	74/39	Тоже	—	1905	4,50	3,00	0,83

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	62	81	Произведенъ ремонтъ: поставлено новыхъ ступень 16 шт., наросены 2 сваи, положены 4 новыхъ насадки, подняты и подтянуты схватки и подкосы, подтянуты болты.
—	—	—	—	—	22	90	Поставлены подъ серединой прогоновъ 6 штукъ свай.
—	—	—	—	—	15	82	Произведенъ мелкій ремонтъ настила, подтянуты болты и исправлены мостовыя схватки.
—	—	—	—	—	8	60	Произведенъ мелкій ремонтъ съ постановкою 4-хъ новыхъ упорныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	7	28	Произведенъ мелкій ремонтъ накатника и положены новые прижимные брусья.
—	—	—	—	—	1	18	Произведенъ мелкій ремонтъ настила.
—	—	—	—	—	2	53	Поставлены вновь одна отлетная тумба и двѣ прижимныхъ тумбы.
—	—	—	—	—	12	10	Произведенъ мелкій ремонтъ накатника и обшивка торцовъ тесомъ.
—	—	—	—	—	12	10	Тоже.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
4	75/40	Деревянный мостъ арочной системы	—	1856	28,66	5	5
6	76/41	Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1852	10,5	4,33	2,00
12	78/43	Деревянный шоссированный мостъ	—	1883	3,00	4,00	0,50
16	79/44	Тоже	—	1888	28,00	4,00	2,00
VIII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Гастомли до ст. Катомки.							
1	81/46	Кирпичная труба	—	1852	18,00	2,45	1,10
2	82/47	Деревянный шоссированный мостъ съ пластизнымъ настиломъ	—	1852	4 1/2	4,00	0,65
5	83/48	Тоже	—	1853	14,00	4,00	2,50
7	84/49	Кирпичная труба	—	1853	16,5	4,00	3,66
12	88/53	Кирпичная труба	—	1853	17,50	4,00	3,00

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	15	80	Произведенъ мелкій ремонтъ устройствъ моста цементомъ.
—	—	—	—	—	5	60	Произведенъ мелкій ремонтъ настила и подтянуты болты.
—	—	—	—	—	108	19	Произведены ремонтъ пластиннаго настила и шоссировка его, подведена одна новая свая и поставлено двѣ отлетныхъ тумбы.
—	—	—	—	—	4	35	Поднянуты болты.
—	—	—	—	—	21	30	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ и крыльевъ трубы цементомъ.
—	—	—	—	—	54	75	Перебранъ съ добавкою 16 шт. новыхъ пластинъ настилъ моста и произведена шоссировка его. Смѣненъ 1 прижимъ и обшиты торцы настила тесомъ.
—	—	—	—	—	3	20	Подведены 3 новыя стула изъ имѣвагося матеріала.
—	—	—	—	—	29	60	Произведенъ мелкій ремонтъ трубы и крыльевъ цементомъ.
—	—	—	—	—	17	81	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ и крыльевъ трубы цементомъ.

№№ верстѣ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
15	91/56	Мостъ на кирпичныхъ стѣнкахъ съ рельсовыми переводами	—	1884	1,00	3,33	0,96
16	93/58	Деревянный мостъ съ пластиннымъ поломъ	—	1852	4,00	4,00	0,66
IX ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Катомки до ст. Головинки.							
1	95/60	Деревянный съ рельсовыми переводами мостъ на каменныхъ устояхъ	—	1875	1,50	3,33	0,95
2	96/61	Кирпичная труба	—	1852	9,53	1,50	1,10
4	97/62	Деревянный мостъ шоссированный	—	1900	3,00	4,00	0,50
7	98/64	Деревянный мостъ съ шоссированнымъ пластиннымъ поломъ	—	1884	3 ² / ₃	3 ¹ / ₃	0,65
Всего			—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1912 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.			Исправленіе.				
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	25	54	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ моста съ оштукатуркою ихъ цементомъ.
—	—	—	—	—	29	60	Произведенъ мелкій ремонтъ настила.
—	—	—	—	—	17	45	Произведенъ мелкій ремонтъ кирпичныхъ стѣнокъ цементомъ и поставлены временно деревянные распорки стѣнокъ.
—	—	—	—	—	19	53	Произведенъ мелкій ремонтъ стѣнокъ и крыльевъ цементомъ.
3,00	3,33	0,80	454	36	—	—	Построенъ взамѣнъ переѣздного мощенаго лотка.
—	—	—	—	—	119	62	Перебранъ и зашоссированъ пластинный полъ съ добавкою 4 шт. новыхъ пластинъ; поставлено новыхъ 10 шт. стульевъ и 5 шт. свай; положены 3 новыхъ насадки и обшиты торцы накатника тесомъ.
—	—	—	454	36	2068	56	
			2522 р. 92 к.				

<p>1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.</p>	<p>1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.</p>
<p>2. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the economic situation.</p>	<p>2. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the economic situation.</p>
<p>3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the social situation.</p>	<p>3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the social situation.</p>
<p>4. The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the political situation.</p>	<p>4. The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the political situation.</p>
<p>5. The fifth part of the report is devoted to a detailed analysis of the cultural situation.</p>	<p>5. The fifth part of the report is devoted to a detailed analysis of the cultural situation.</p>
<p>6. The sixth part of the report is devoted to a detailed analysis of the international situation.</p>	<p>6. The sixth part of the report is devoted to a detailed analysis of the international situation.</p>
<p>7. The seventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the future prospects.</p>	<p>7. The seventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the future prospects.</p>

1950

ВѢДОМОСТЬ

расходовъ, произведенныхъ въ 1912 году за счетъ смѣты
1913 года.

	СУММА.	
	РУБ.	К.
1) Заготовка щебня:		
на Витебско-Орловскомъ шоссе	654	55
на Подольско-Харьковскомъ шоссе	692	32
2) Ремонтъ мостовъ:		
на Витебско-Орловскомъ шоссе	2912	72
на Подольско-Харьковскомъ шоссе	462	47
3) Развѣзды по заготовкѣ лѣснаго матеріала для ремонта мостовъ на Орловско-Витебскомъ шоссе	146	—
4) Покупка 2-хъ велосипедовъ для дорожныхъ мастеровъ -Х и XI перегоновъ Витебско- Орловскаго шоссе и VII - IX перегоновъ По- дольско-Харьковскаго шоссе, по 115 р. каждый	230	—
5) Перевозка 2-хъ катковъ для укатки полотна на V и VI перегонахъ Витебско-Орловскаго шоссе	61	25
6) Заготовка дровъ для квартиры дорожнаго ма- стера VII перегона Подольско-Харьковскаго шоссе въ г. Кромахъ и перевозка вѣхъ для постановки на шоссе	71	50
7) Пособіе ремонтнику Воронежскаго шоссе Лав- рищеву (лѣтнія работы)	50	—
И т о г о	5280	81

ВѢДОМОСТЬ

расходовъ, произведенныхъ въ 1912 году изъ шоссеиныхъ остатковъ.

	СУММА.	
	РУБ.	К.
1) Отослано инженеру А. К. Рождественскому за составленіе трехъ эскизныхъ проектовъ мостовъ, на Подольско-Харьковскомъ шоссе . . .	500	—
2) Отослано въ Дмитровскую уѣздную земскую управу на дорожныя работы (подъѣздной путь къ ст. Комаричи)	7780	—
3) Отослано въ Трубчевскую уѣздную земскую управу на дорожныя работы (по замощенію Бурачевской гати)	4495	—
4) Выдано техническому персоналу управы за работы по пересоставленію смѣтъ, на перестройку городскихъ участковъ шоссе	338	75
5) Выдано старшему инженеру Б. А. Жежеро, въ возвратъ израсходованныхъ на служебныя поѣздки	238	55
Итого	13352	30

ВѢДОМОСТЬ

суммъ разныхъ поступленій за 1912 годъ.

Оставалось на 1-е января 1912 года . . . 4182 р. 57 к.

Поступило въ 1912 году:

1) Арендной платы за сдачу разнымъ лицамъ шоссеиныхъ резервовъ 729 р. 39 к.

2) Получено отъ Талызинскаго волостнаго правленія, Орловскаго уѣзда, взысканные по исполнительнымъ листамъ съ крестьянъ Астахова и Широкова за порчу резервовъ 6 р. 44 к.

3) Получено отъ И. Сырцева за купленный имъ старый велосипедъ, бывшій дорожнаго мастера 10 р. 50 к.

4) Получено отъ дорожнаго мастера Витебско-Орловскаго шоссе Н. Смирнова, вырученные имъ отъ продажи стараго лѣсного матеріала 7 р. — к.

5) Получено отъ члена управы графа Беннигсена, за остановку на земской квартирѣ въ гор. Карачевѣ 9 р. — к.

Итого поступило 762 р. 33 к.

Всего прихода съ остаткомъ 4944 р. 90 к.


Израсходовано въ 1912 году:

1) Отослано въ Карачевскую гимназію за право ученія дѣтей умершаго дорожнаго мастера Улеріанова 60 р. — к.

2) Выдано пособіе ремонтщику Подольско-Харьковскаго шоссе Горбатенкову 78 р. — к.

3) Выдано пособія ремонтщику Подольско-Харьковского шоссе Полякову	20 р. — к.
4) Выдано пособіе дорожному мастеру Воронежскаго шоссе Гадову	45 р. — к.
5) Выдано бывшему ремонтному рабочему Витебско-Орловскаго шоссе Китасову, въ награду за службу	102 р. — к.
6) Выдано пособіе технику, по Сѣвскому уѣзду, Н. Ф. Левшину	100 р. — к.
7) Выдано въ награду губернскому технику Г. С. Михневичу	100 р. — к.
8) Выдано въ награду чертежнику дорожнаго отдѣла В. Н. Дмитріеву	30 р. — к.
9) Выдано присяжному повѣренному А. І. Кржевскому за веденіе дѣлъ	99 р. 67 к.
10) Выдано старшему инженеру дорожнаго отдѣла Б. А. Жежеро, въ возвратъ израсходованныхъ на служебныя поѣздки	191 р. 85 к.
<hr/>	
Итого израсходовано	826 р. 52 к.
Осталось на 1-е января 1913 года	4118 р. 38 к.





18

